


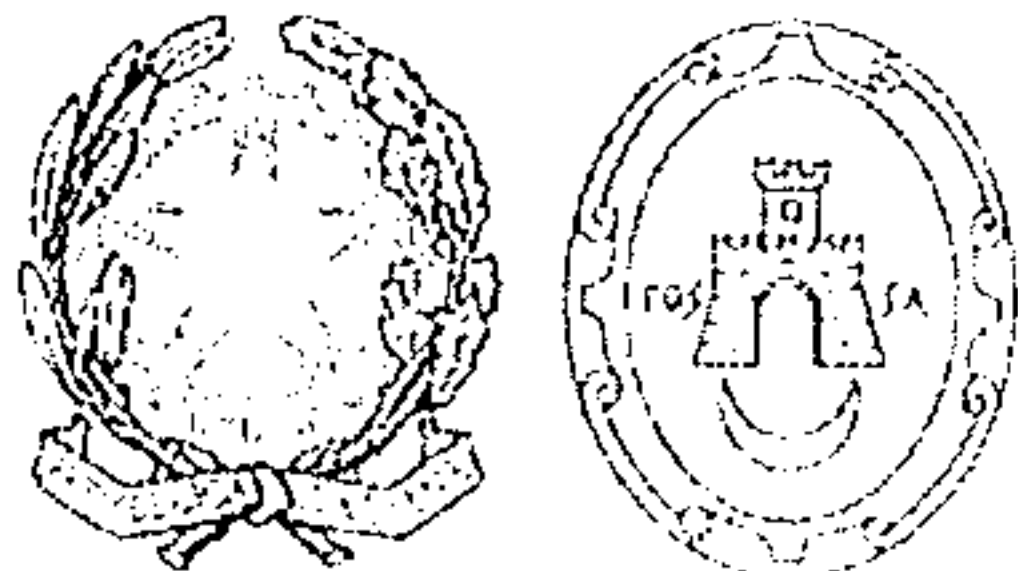

**U.S.R.C**

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del

Fossa 04/02/2021

Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
Comuni del Cratere

|                                                                                   |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| PERETTI BRUNO                                                                     | 2021 | PARTENZA   |
| Prot.n. 1852                                                                      | Del  | 04/02/2021 |
|  |      |            |

A DI GENNARO SIMONE (Presidente di Consorzio)  
simone.diegennaro@geopec.it

COMUNE DI TOSSICIA (TE)  
lavoripubblici@comunetossicia.gov.it

e.p.c. DIRETTORE DEL LAVORI:  
Ing. Daniele Zavanelli  
daniele.zavanelli@ingte.it

IMPRESA: Costruzioni Edil 4 S.r.l.  
costruzioni.edil4@officepec.com

Sportello decentrato n. 3  
utr3@pec.it

**Oggetto: APPROVAZIONE E TRASMISSIONE DELLA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### IL TITOLARE DELL'USRC

VISTO l'art. 2-bis, comma 32, decreto legge n. 148 del 2017 convertito in legge n. 176 del 2017;


RICHIAMATO il DPCM del 13 dicembre 2018 con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere all'Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio;

VISTA la documentazione relativa alla proposta avanzata dal Responsabile del Procedimento degli sportelli decentrati dell'USRC sulla base degli atti forniti dal richiedente;

#### APPROVA E TRASMETTE

La proposta avanzata dal Responsabile del Procedimento prot. USRC/SP 3 n. 38/U del 01/02/2021.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere  
*Ing. Raffaello Fico*

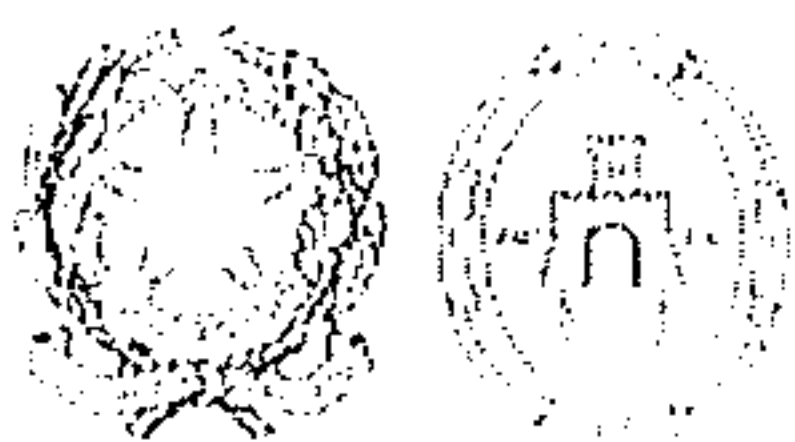**U.S.R.C.****MODELLO ESITO S.A.L. FINALE**

Rev. 2 del 6/7/2018

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USRC/SP 3</b> di Montorio al Vomano<br>Indirizzo Via L.B. Patrizi, 3<br>Cap 64046 Prov. (TE)<br>Tel. 0862 753100 Fax -<br>C.F./P.IVA - | <i>Prot. USRC/SP 03</i><br><i>n. 38/U del 01/02/2021</i><br><i>Elenco approvazione proposta SAL Prot. USRC</i><br><i>n. _____ del _____</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Proposta di Liquidazione del Contributo relativo al S.A.L. FINALE****Prot. Norm. TE-TOS-E-01236 del 23/03/2018****Codice CUP I87C18000180001****Decreto di Concessione n. 2 del 06/03/2019****Comune di Tossicia (TE)****Richiedente: DI GENNARO SIMONE – Presidente del Consorzio**

L'USRC / SP3 con sede in Montorio al Vomano Via L.B. Patrizi n.3, nella persona del Responsabile del Procedimento geom. Adalberto SACCHINI, in riferimento alla pratica in oggetto, relativa ai lavori di riparazione/ricostruzione di:

☐ ES (Edificio Singolo)☒ UMI/AE (Unità Minima di Intervento/Aggregato Edilizio): Aggregato Edilizio B1.8☐ Eventuali parti esclusive associate di cui all'**ELENCO 1** allegato al presente documento

sito in via/piazza Piazzale Sant'Emidio, n° snc

località Tossicia Aggregato n° B1.8

Foglio n° 18 Partic. P.Ila n° 124 subb. 6, 7, 8, 9 e 10.


Identificativo Consorzio "Terra Secondo" Aggregato B1.8. Data scadenza 16/10/2022

**TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO: € 518.993,34**

come di seguito:

|                                   | <b>totale</b> | <b>di cui finanziati</b> | <b>di cui in acollo</b> |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>IMPORTO PROGETTO APPROVATO</b> | € 518.993,34  | <b>€ 518.993,34</b>      | € 0,00                  |
| <i>di cui per lavori, netti</i>   | € 395.817,68  | € 395.817,68             | € 0,00                  |

**TOTALE CONTRIBUTO già erogato: € 424.333,54****Visto** il Decreto USRC n° 1/2014 ed in particolare l'Art. 13 del Decreto stesso;**Vista** la Circolare USRC n° 3 del 24/10/2016;**Visto** il Decreto di concessione contributo n° 2 del 06/03/2019 rilasciato dal Comune di Tossicia (TE) per un importo complessivo di € 518.993,34;**Vista** la Comunicazione di inizio lavori Prot. n° 927 del 13/03/2019;**Vista** la Comunicazione di fine lavori Prot. n° 3599 del 26/10/2020;**Vista** la Richiesta di liquidazione S.A.L. FINALE, per un importo di € 89.193,33, acquisita al protocollo USRC n° 14355 del 07/11/2020;

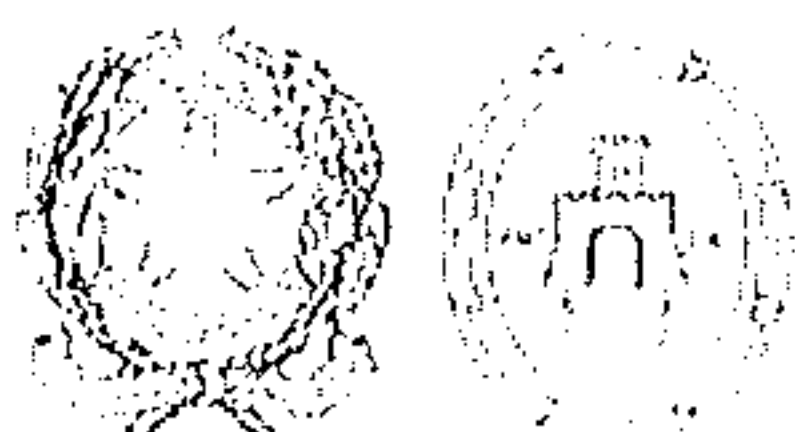

**Vista** la Richiesta di completamento Prot. USRC n° 15950 del 24/11/2020;

**Vista** la comunicazione di avvio procedimento di verifica istruttoria SAL Finale estratto ai sensi della Circolare USRC n. 13 del 01/08/2019, inviata con prot. USRC/SP3 n. 748/U del 16/12/2020;

**Vista** la documentazione integrativa acquisita al Prot. USRC n° 1141 del 22/01/2021 e da ultimo al Prot. USRC n° 1396 del 27/01/2021;

**Visti** gli importi già liquidati, relativi al pagamento dei precedenti S.A.L. di cui all'**ELENCO 2** allegato al presente documento;

**Vista** la dichiarazione del tecnico sottoscritta dal beneficiario circa la non ricorrenza dei casi di cui alle Varianti Sostanziali;

**Visto** il certificato di pagamento n° 4 sottoscritto dal Direttore dei Lavori;

**Richiamato** l'art. 2-bis del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito in legge n. 172 del 2017;

**Richiamata** la Determina USRC n.353 del 29/06/2018 a firma del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ad interim Ing. Raniero Fabrizi e le conseguenti disposizioni organizzative;

**Richiamato** il DPCM del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21/12/2018 nel registro dell'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio;

**Richiamata** la Disposizione di servizio n. 8 del 24/01/2019 a firma del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con la quale è stata conferita al dipendente Adalberto Sacchini la responsabilità di tutti i procedimenti di competenza dello Sportello di Montorio al Vomano;


**Richiamata** la Disposizione di servizio n. 9 del 24/01/2019 a firma del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con la quale sono stabilite, tra l'altro, le procedure per l'emissione dei provvedimenti finali a firma del Titolare stesso;

**Esaminati** gli atti istruttori predisposti dal personale dello Sportello 3 ai sensi della Circolare USRC n° 3 del 24/10/2016 e n. 12 del 31/07/2019 sulla documentazione amministrativa trasmessa;

### **PROPONE**

la presente istruttoria, concernente la richiesta di contributo relativo allo stato di avanzamento lavori finale a tutto il 26/10/2020, fatta salva la regolarità contributiva delle imprese esecutrici, per l'importo complessivo lordo di **€ 89.193,33**, comprensivo delle eventuali somme riferite alle parti esclusive di cui all'**ELENCO 1** allegato, suddiviso come segue:

|                           | netto       | oneri<br>previdenziali | IVA        | tot                |
|---------------------------|-------------|------------------------|------------|--------------------|
| LAVORI                    | € 72.960,70 |                        | € 7.296,07 | <b>€ 80.256,77</b> |
| COMPETENZE TECNICHE       | € 5.647,07  | € 225,88               | € 838,41   | <b>€ 6.711,36</b>  |
| INDAGINI GEO-STRU         |             |                        | € 0,00     | <b>€ 0,00</b>      |
| PRESIDENTE/AMMINISTRATORE | € 1.737,08  | € 86,85                | € 401,27   | <b>€ 2.225,20</b>  |
|                           | € 80.344,85 | € 312,74               | € 8.535,74 | <b>€ 89.193,33</b> |

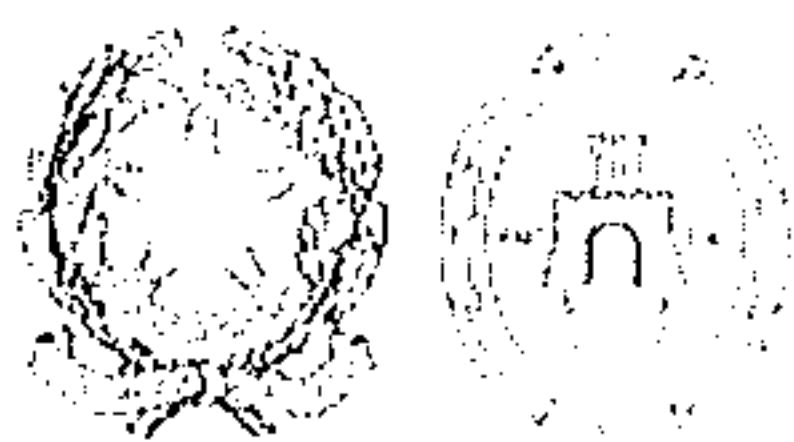

e come meglio dettagliato nell'allegato **ELENCO 4**, a favore di **Di Gennaro Simone**, in qualità di Presidente del Consorzio, sul C.C. n° IT49V0542477080000001000077;

All'esito dell'istruttoria eseguita si riporta il quadro finale di assestamento ammesso:

| IMPORTI CONCESSI                                           | netto        | oneri previdenziali | IVA         | tot          |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| LAVORI                                                     | € 395.817,68 |                     | € 39.581,77 | € 435.399,45 |
| COMPETENZE TECNICHE                                        | € 57.203,00  | € 2.209,87          | € 13.070,83 | € 72.483,70  |
| INDAGINI GEO-STRU                                          | € 881,23     |                     | € 88,12     | € 969,35     |
| PRESIDENTE/AMMINISTRATORE                                  | € 8.312,17   |                     | € 1.828,67  | € 10.140,84  |
|                                                            | € 462.214,08 | € 2.209,87          | € 54.569,39 | € 518.993,34 |
|                                                            |              |                     |             |              |
|                                                            |              |                     |             |              |
| IMPORTI LIQUIDABILI<br>(comprensivi degli importi a saldo) | netto        | oneri previdenziali | IVA         | tot          |
| LAVORI                                                     | € 395.817,33 |                     | € 39.581,73 | € 435.399,06 |
| COMPETENZE TECNICHE                                        | € 57.171,37  | € 2.075,01          | € 8.254,13  | € 67.500,51  |
| INDAGINI GEO-STRU                                          | € 881,23     |                     | € 88,12     | € 969,35     |
| PRESIDENTE/AMMINISTRATORE                                  | € 7.916,35   |                     | € 1.741,60  | € 9.657,95   |
|                                                            | € 461.786,27 | € 2.075,01          | € 49.665,58 | € 513.526,88 |
|                                                            |              |                     |             |              |
|                                                            |              |                     |             |              |
| ECONOMIE                                                   | netto        | oneri previdenziali | IVA         | tot          |
| LAVORI                                                     | € 0,35       |                     | € 0,03      | € 0,38       |
| COMPETENZE TECNICHE                                        | € 31,63      | € 134,86            | € 4.816,70  | € 4.983,19   |
| INDAGINI GEO-STRU                                          | € 0,00       |                     | € 0,00      | € 0,00       |
| PRESIDENTE/AMMINISTRATORE                                  | € 395,82     |                     | € 87,08     | € 482,90     |
|                                                            | € 427,80     | € 134,86            | € 4.903,82  | € 5.466,48   |


Totale importi liquidabili

(comprensivi degli Importi a saldo)

| IMPORTI LIQUIDABILI<br>(comprensivi degli importi a saldo) | netto        | oneri previdenziali | IVA         | tot          |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| LAVORI                                                     | € 395.817,33 |                     | € 39.581,73 | € 435.399,06 |
| COMPETENZE TECNICHE                                        | € 57.171,37  | € 2.075,01          | € 8.254,13  | € 67.500,51  |
| INDAGINI GEO-STRU                                          | € 881,23     |                     | € 88,12     | € 969,35     |
| PRESIDENTE/AMMINISTRATORE                                  | € 7.916,35   |                     | € 1.741,60  | € 9.657,95   |
|                                                            | € 461.786,27 | € 2.075,01          | € 49.665,58 | € 513.526,88 |

Economie

| ECONOMIE                  | netto    | oneri previdenziali | IVA        | tot        |
|---------------------------|----------|---------------------|------------|------------|
| LAVORI                    | € 0,35   |                     | € 0,03     | € 0,38     |
| COMPETENZE TECNICHE       | € 31,63  | € 134,86            | € 4.816,70 | € 4.983,19 |
| INDAGINI GEO-STRU         | € 0,00   |                     | € 0,00     | € 0,00     |
| PRESIDENTE/AMMINISTRATORE | € 395,82 |                     | € 87,08    | € 482,90   |
|                           | € 427,80 | € 134,86            | € 4.903,82 | € 5.466,48 |

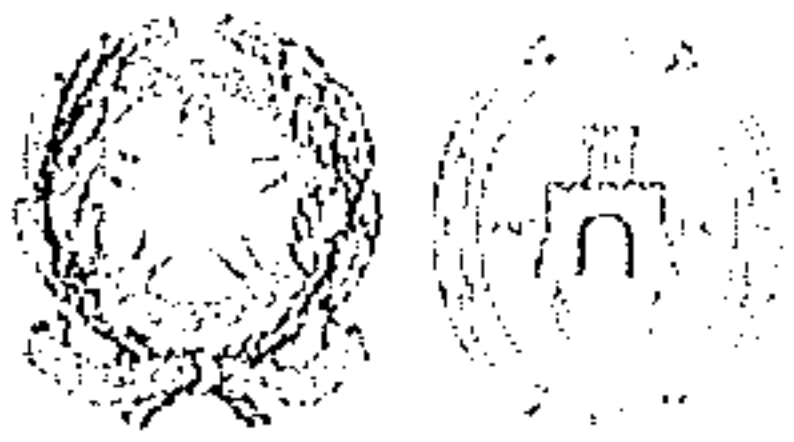

Si allega copia delle fatture quietanzate relative al precedente SAL n° 3, di cui all'**ELENCO 3**.

**Gli importi di cui sopra possono essere liquidati solo a seguito di trasmissione al Comune della documentazione riguardante l'esecuzione di migliorie, come dichiarato nel modello B22.**

### **COMUNICA**

- **i seguenti dati ai fini delle verifiche di competenza del Comune sulla regolarità contributiva:**

**Dati dell'impresa appaltatrice/esecutrice dei lavori:**

Ragione Sociale: Costruzioni Edil 4 Srl;

Indirizzo: V.le Risorgimento, 157 64046 – Montorio al Vomano (TE); Telefono: 0861/592799

Email / PEC: costruzioni.edil4@officepec.com;

Partita IVA: 01616420673; Posizione INPS: 7903626296;

Posizione INAIL: 14281167 Posizione Cassa Edile: 2619 (Teramo);

Importo Lavori: € 72.960,70;

Periodi di esecuzione Lavori: dal 23/03/2020 al 26/10/2020;

Tipologia Lavori: Lavori di riparazione danni da sisma ed interventi di rinforzo locale.

☒ relativamente al S.A.L. corrente si indicano i dati delle seguenti imprese subappaltatrici:

**Dati dell'impresa subappaltatrice n° 1:**

Ragione Sociale: EDIL Ci & Ti di Pavone Ciro e C. snc;

Indirizzo: C.da Garisciano 1, Tossicia (TE); Telefono: 28 8349206

Email / PEC: tinoEciro@hotmail.it;

Partita IVA: 01675770679; Posizione INPS: 7903907931;

Posizione INAIL: 92414269 / PAT 14584994; Posizione Cassa Edile: 4712;

Importo Lavori: € 1.500,00; (risultante da dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Periodi di esecuzione Lavori: dal 01/02/2020;

Tipologia Lavori: Realizzazione massetti

**Dati dell'impresa subappaltatrice n° 2:**

Ragione Sociale: DI NICOLANTONIO Vincenzo;

Indirizzo: Via Piane Mulino, 64100 Teramo (TE); Telefono: 347 9404684

Email / PEC: vincenzodinicolantonio@pec.it;

Partita IVA: 01406270676; Posizione INPS: Artigiani 15304614RJ;

Posizione INAIL: 90984094/57 Posizione Cassa Edile: =====;


Importo Lavori: € 6.300,00;

Periodi di esecuzione Lavori: gennaio/febbraio e maggio/giugno 2020;

Tipologia Lavori: impianto idro-sanitario e gas;

**Dati dell'impresa subappaltatrice n° 3:**

Ragione Sociale: VINCENZO DI BONIFACIO SRL;

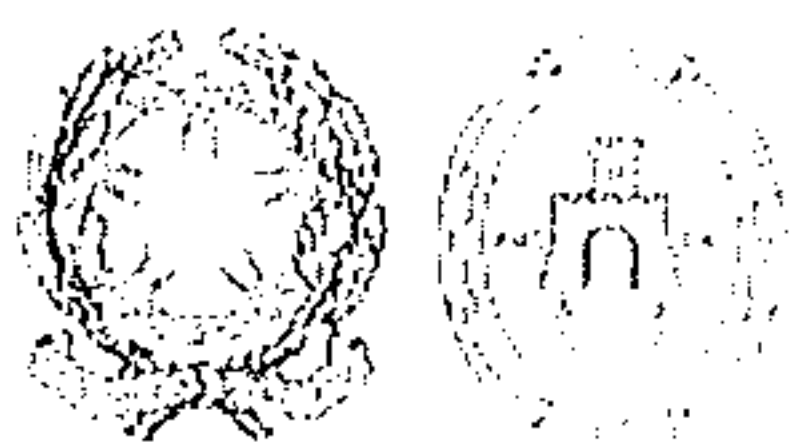

Indirizzo: Via Scanzature 7, 64037 Cermignano (TE); Telefono: 328 0143343

Email / PEC: vincenzodibonifacio@libero.it;

Partita IVA: 01920730676; Posizione INPS: 7904904801;

Posizione INAIL: 19581559/72 Posizione Cassa Edile: 5494;

Importo Lavori: € 9.000,00;

Periodi di esecuzione Lavori: febbraio 2020;

Tipologia Lavori: realizzazione intonaci

**Dati dell'impresa subappaltatrice n° 4:**

Ragione Sociale: TARQUINI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI;

Indirizzo: Fraz. Villa Maggiore – 64046 Montorio al Vomano (TE); Telefono: 3483626596

Email / PEC: Giovanni.tarquini@alice.it;

Partita IVA: 00813070679; Posizione INPS: 7902325255;

Posizione INAIL: 15863710 Posizione Cassa Edile: -----;

Importo Lavori: € 7.800,00;

Periodi di esecuzione Lavori: gennaio/febbraio e maggio/giugno 2020;

Tipologia Lavori: impianto elettrico

**Dati dell'impresa subappaltatrice n° 5:**

Ragione Sociale: VOLPE PERFORAZIONI SAS;

Indirizzo: Villa Vomano - Via Nazionale 37, 64100 Teramo (TE); Telefono: 340 3572379

Email / PEC: volpeperforazioni@gmail.com;

Partita IVA: 01980780678; Posizione INPS: 16658692 EU39;

Posizione INAIL: 19993926/62 Posizione Cassa Edile: 6289;

Importo Lavori: € 2.500,00;

Periodi di esecuzione Lavori: Agosto-Settembre 2019;

Tipologia Lavori: trivellazioni, pali fondazione

---

**• le seguenti note per il seguito di competenza:****NOTE PER IL COMUNE:**

*La liquidazione del SAL è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva delle Imprese Esecutrici, di competenza del Comune.*

In particolare si evidenzia che la Ditta **Costruzioni Edil 4 Srl** e la ditta subappaltatrice **Edil Cl. & Tl. S.n.c.** risultano attualmente "in rinnovo"

**IN CASO DI MIGLIORIE IN ACCOLLO**

*Ai fini della liquidazione del SAL, vista la dichiarazione del modello B22, si richiama quanto previsto dall'art. 11 co. 5bis Legge 125/2015 in merito all'acquisizione della certificazione relativa alla contrattualizzazione dei lavori extra contributo e relative quietanze di pagamento (migliorie o altri interventi difformi) a firma del Direttore dei Lavori, Presidente/Amministratore o, nel caso di interventi su edifici singoli/parti esclusive, del Committente anche per quanto attiene la liquidazione delle spese tecniche previste per la quota in acollo.*

*Successivamente alla liquidazione del SAL, il Comune dovrà provvedere alla trasmissione della copia della determina di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento allo Sportello USRC di riferimento.*



**NOTE PER IL BENEFICIARIO:**

*Si rammenta che i bonifici relativi all'ultimo SAL dovranno essere trasmessi entro 15 giorni dall'erogazione dello stesso.*

---

**TRASMETTE**

Il presente atto al Titolare per il seguito di competenza.

Data: 01/02/2021

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Adalberto SACCHINI

Istruttore tecnico

Arch. Antonella Di Emidio

Riferimenti a cui inviare il provvedimento definitivo del Titolare:

**DI GENNARO SIMONE** (Presidente di Consorzio)

*simone.diegennaro@geopec.it*

**COMUNE DI TOSSICIA (TE)**

*lavoripubblici@comunetossicia.gov.it*


**DIRETTORE DEL LAVORI:**

**Ing. Daniele Zavanelli**

*daniele.zavanelli@ingte.it*

**IMPRESA:** Costruzioni Edil 4 S.r.l.

*costruzioni.edil4@officepec.com*

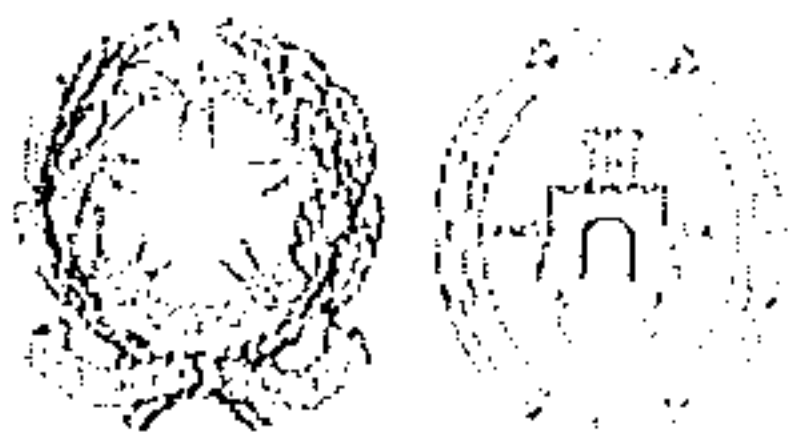**USRC / SP3** con sede in Montorio al Vomano

Esito Istruttoria liquidazione del contributo relativo al S.A.L. FINALE


**ELENCO 1**Parti esclusive associate **da istruttoria:**

| U.I. | Cognome e Nome | C.F. | Tipologia di lavori e importi |                         |                                    | TOTALE | di cui in<br>accollo |
|------|----------------|------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------|----------------------|
|      |                |      | h/i                           | lavori<br>(IVA inclusa) | spese<br>tecniche<br>(IVA inclusa) |        |                      |
| 1    |                |      |                               |                         |                                    |        |                      |
| 2    |                |      |                               |                         |                                    |        |                      |
| 2    |                |      |                               |                         |                                    |        |                      |
|      |                |      | TOTALE                        | € 0,00                  | € 0,00                             | € 0,00 | € 0,00               |

Parti esclusive associate **al SAL FINALE:**

| U.I. | Cognome e Nome | C.F. | Tipologia di lavori e importi |                         |                                    | TOTALE | di cui in<br>accollo |
|------|----------------|------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------|----------------------|
|      |                |      | h/i                           | lavori<br>(IVA inclusa) | spese<br>tecniche<br>(IVA inclusa) |        |                      |
| 1    |                |      |                               |                         |                                    |        |                      |
| 2    |                |      |                               |                         |                                    |        |                      |
| 2    |                |      |                               |                         |                                    |        |                      |
|      |                |      | TOTALE                        | € 0,00                  | € 0,00                             | € 0,00 | € 0,00               |

Ai fini della liquidazione del SAL, per le quote riguardanti le migliorie, si rimanda al Comune la verifica dei contratti di lavoro e delle quietanze di pagamento dei lavori eseguiti come da dichiarazione MODELLO B22, oltre alla verifica delle quietanze di pagamento per le quote in accollo relative alle spese tecniche.

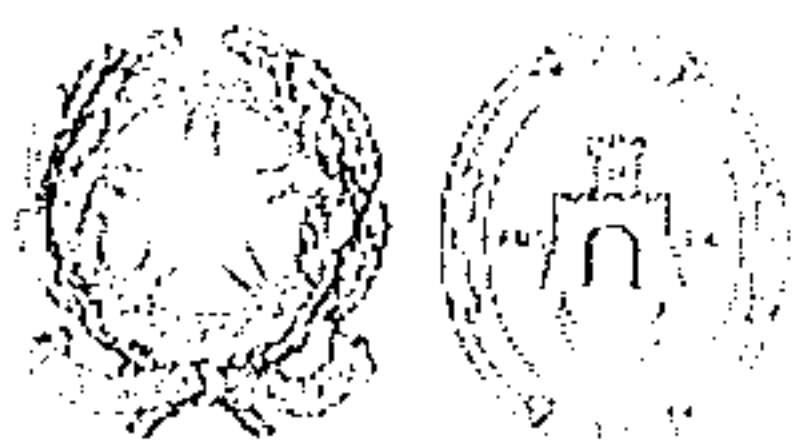
**USRC / SP3** con sede in Montorio al Vomano

Esito Istruttoria liquidazione del contributo relativo al S.A.L. FINALE.

**ELENCO 2**

Importi già liquidati relativi ai pagamenti dei precedenti S.A.L.:

|                      |   |        |            |              |
|----------------------|---|--------|------------|--------------|
| ANTICIPAZIONE        |   | 9/280  | 24/05/2019 | € 87.079,89  |
| SAL TECNICO          | / | 10/315 | 07/06/2019 | € 34.316,64  |
| SAL 1                | / | 15/559 | 15/10/2019 | € 100.493,12 |
| SAL 2                | / | 20/638 | 03/12/2019 | € 127.134,48 |
| SAL 3                | / | 11/307 | 27/05/2020 | € 75.309,41  |
| totale già liquidato |   |        |            | € 424.333,54 |

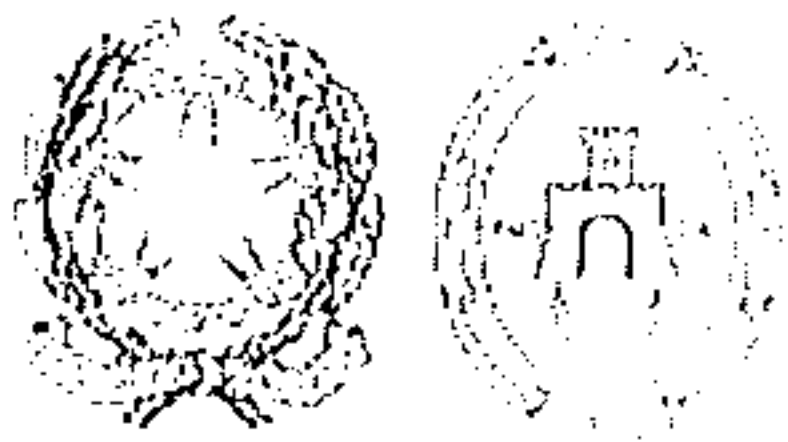**U.S.R.C.****MODELLO ESITO S.A.L. FINALE**

Rev. 2 del 6/7/2018


**USRC / SP3** con sede in Montorio al Vomano

Esito Istruttoria liquidazione del contributo relativo al S.A.L. FINALE.

**ELENCO 3**

Fatture riscontrate con bonifico relative al S.A.L. precedente n° 3, allegate in copia:

| denominazione          | fattura n. | data       | importo            |
|------------------------|------------|------------|--------------------|
| COSTRUZIONI EDIL 4 SRL | 9/001      | 21/05/2020 | € 65.093,64        |
| Ing. D. Zavanelli      | 6          | 21/05/2020 | € 3.389,36         |
| Ing. P. Ceci           | 1          | 21/05/2020 | € 1.681,62         |
| Di Gennaro Simone      | 8          | 21/05/2020 | € 1.804,98         |
| Arch. P. Marcozzi      | 2          | 27/04/2020 | € 3.339,80         |
|                        |            |            | <b>€ 75.309,41</b> |

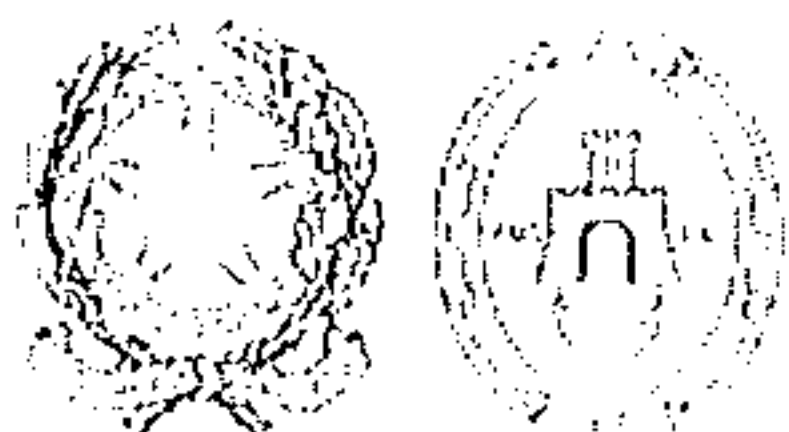**USRC / SP3** con sede in Montorio al Vomano

Esito Istruttoria liquidazione del contributo relativo al S.A.L. FINALE.

**ELENCO 4**Distinta importi **erogabili** relativi al presente S.A.L.

| LAVORI                    | netto       |                     | IVA        | tot                |
|---------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------|
| Costruzioni EDIL4 S.r.l.  | € 72.960,70 |                     | € 7.296,07 | € 80.256,77        |
|                           |             |                     | € 0,00     | € 0,00             |
| <b>TOTALE</b>             | € 72.960,70 |                     | € 7.296,07 | € 80.256,77        |
|                           |             |                     |            |                    |
| COMPETENZE TECNICHE       | netto       | oneri previdenziali | IVA        | tot                |
| Ing. D. Zavanelli         | € 3.664,37  | € 146,57            | € 838,41   | € 4.649,35         |
| Ing. P. Ceci              | € 1.982,70  | € 79,31             | € 0,00     | € 2.062,01         |
|                           |             |                     |            |                    |
| <b>TOTALE</b>             | € 5.647,07  | € 225,88            | € 838,41   | € 6.711,36         |
|                           |             |                     |            |                    |
| INDAGINI                  | netto       |                     | IVA        | tot                |
| GEO - @                   |             |                     | € 0,00     | € 0,00             |
| STRU - @                  |             |                     | € 0,00     | € 0,00             |
| <b>TOTALE</b>             | € 0,00      | € 0,00              | € 0,00     | € 0,00             |
|                           |             |                     |            |                    |
| PRESIDENTE/AMMINISTRATORE | netto       | oneri previdenziali | IVA        | tot                |
| Geom. Di Gennaro Simone   | € 1.737,08  | € 86,85             | € 401,27   | € 2.225,20         |
| <b>TOTALE</b>             | € 1.737,08  | € 86,85             | € 401,27   | € 2.225,20         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>    |             |                     |            | <b>€ 89.193,33</b> |
