


COMUNE DI VENAROTTA

AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2020

A norma delle leggi che regolano i diritti d'autore questo disegno non può essere riprodotto, copiato o fornito ad altri, senza specifica autorizzazione del progettista

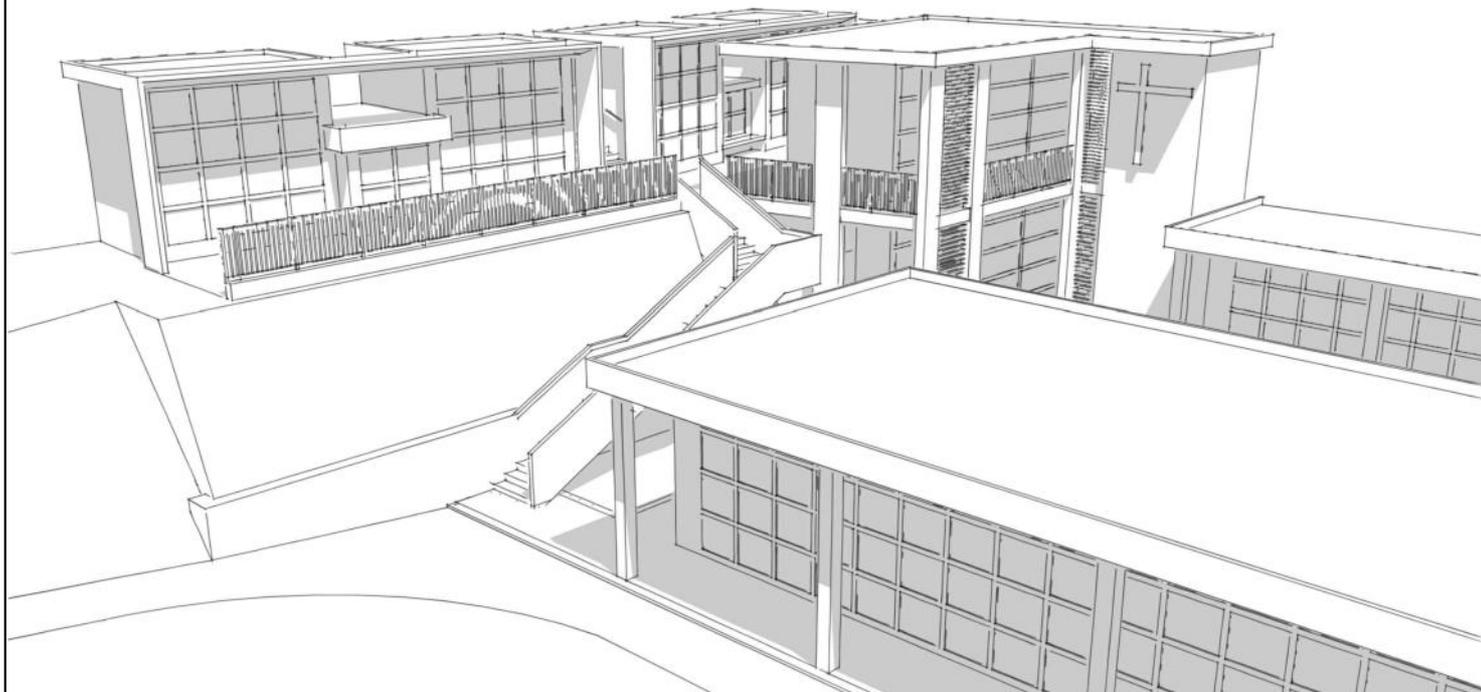

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

Comune di Venarotta
Via del Castello
Provincia di Ascoli Piceno

COMMITTENTE

Comune di Venarotta

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Gino Santoni

EMESSO PER

Approvazione del progetto definitivo-esecutivo ed
acquisizione dei relativi pareri

CIG
Z0A2D57439

CUP
C66D20000010004

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016)

DOCUMENTO
CRONOPROGRAMMA

D.09

DATA
Agosto 2020

FILE
Cronoprogramma

REV
0 0 0

PROGETTISTA

Arch. Matteo Cameli
Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno n.1119

COLLABORATORI

Ing. Valentina Fanesi



MATTEO CAMELI ARCHITETTO
San Benedetto del Tronto - 63074
Via Asiago, n.90
389-7945611
matteo.cameli.arch@gmail.com
matteo.cameli@archiworldpec.it

ID	Nome attività	Durata	02 nov 20							09 nov 20							16 nov 20							23 nov 20							30 nov 20							07 dic 20							14 dic 20		
			S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L
1	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2020	130 g	[Gantt bar]																																												
2	1. Allestimento Cantiere	5 g	[Gantt bar]																																												
3	Allestimento dell'area di cantiere	5 g	[Gantt bar]																																												
4	2. Demolizioni e rimozioni	5 g	[Gantt bar]																																												
5	Demolizione di muro in calcestruzzo armato	3 g	[Gantt bar]																																												
6	Rimozione balaustra e taglio cordolo in c.a. II° livello	2 g	[Gantt bar]																																												
7	3. Opere strutturali	50 g	[Gantt bar]																																												
8	Scavo di sbancamento per platea di fondazione in c.a.	2 g	[Gantt bar]																																												
9	Realizzazione platea di fondazione in c.a.	8 g	[Gantt bar]																																												
10	Realizzazione pilastri I° livello	8 g	[Gantt bar]																																												
11	Realizzazione fondazione in micropali II° livello	8 g	[Gantt bar]																																												
12	Realizzazione soletta II° livello	8 g	[Gantt bar]																																												
13	Realizzazione pilastri II° livello	8 g	[Gantt bar]																																												
14	Realizzazione soletta copertura	8 g	[Gantt bar]																																												
15	4. Opere edili	25 g	[Gantt bar]																																												
16	Realizzazione di murature di tamponamento	4 g	[Gantt bar]																																												
17	Realizzazione massetti	5 g	[Gantt bar]																																												
18	Posa in opera di loculi prefabbricati in vetroresina	15 g	[Gantt bar]																																												
19	Realizzazione tramezzi	1 g	[Gantt bar]																																												
20	5. Finiture e rivestimenti	20 g	[Gantt bar]																																												
21	Posa in opera di pavimenti	5 g	[Gantt bar]																																												
22	Intonaci, rivestimenti e tinteggiature	5 g	[Gantt bar]																																												
23	Posa in opera balaustre e schermature	5 g	[Gantt bar]																																												
24	Realizzazione manto di copertura in pannelli sandwich	3 g	[Gantt bar]																																												
25	Canali di gronda, discendenti e scossaline	2 g	[Gantt bar]																																												
26	6. Impianti	10 g	[Gantt bar]																																												
27	Realizzazione dell'impianto idrico e di scarico	5 g	[Gantt bar]																																												
28	Realizzazione dell'impianto d'illuminazione	5 g	[Gantt bar]																																												
29	7. Pensiline su loculi esistenti	5 g	[Gantt bar]																																												
30	Realizzazione sottostruttura metallica di sostegno	3 g	[Gantt bar]																																												
31	Rivestimento in pannelli di fibrocemento	1 g	[Gantt bar]																																												
32	Posa in opera di scossaline	1 g	[Gantt bar]																																												
33	6. Sistemazioni generali	5 g	[Gantt bar]																																												
34	Realizzazione pavimentazione esterna di collegamento	4 g	[Gantt bar]																																												
35	Posa di erba in zolle	1 g	[Gantt bar]																																												
36	7. Smobilizzo dell'area di cantiere	5 g	[Gantt bar]																																												
37	Pulizia e smobilizzo dell'area di cantiere	5 g	[Gantt bar]																																												

ID	Nome attività	Durata	22 mar 21				29 mar 21				05 apr 21				12 apr 21				19 apr 21				26 apr 21								
			G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G
1	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2020	130 g																													
2	1. Allestimento Cantiere	5 g																													
3	Allestimento dell'area di cantiere	5 g																													
4	2. Demolizioni e rimozioni	5 g																													
5	Demolizione di muro in calcestruzzo armato	3 g																													
6	Rimozione balaustra e taglio cordolo in c.a. II° livello	2 g																													
7	3. Opere strutturali	50 g																													
8	Scavo di sbancamento per platea di fondazione in c.a.	2 g																													
9	Realizzazione platea di fondazione in c.a.	8 g																													
10	Realizzazione pilastri I° livello	8 g																													
11	Realizzazione fondazione in micropali II° livello	8 g																													
12	Realizzazione soletta II° livello	8 g																													
13	Realizzazione pilastri II° livello	8 g																													
14	Realizzazione soletta copertura	8 g																													
15	4. Opere edili	25 g																													
16	Realizzazione di murature di tamponamento	4 g																													
17	Realizzazione massetti	5 g																													
18	Posa in opera di loculi prefabbricati in vetroresina	15 g																													
19	Realizzazione tramezzi	1 g																													
20	5. Finiture e rivestimenti	20 g																													
21	Posa in opera di pavimenti	5 g																													
22	Intonaci, rivestimenti e tinteggiature	5 g																													
23	Posa in opera balaustre e schermature	5 g																													
24	Realizzazione manto di copertura in pannelli sandwich	3 g																													
25	Canali di gronda, discendenti e scossaline	2 g																													
26	6. Impianti	10 g																													
27	Realizzazione dell'impianto idrico e di scarico	5 g																													
28	Realizzazione dell'impianto d'illuminazione	5 g																													
29	7. Pensiline su loculi esistenti	5 g																													
30	Realizzazione sottostruttura metallica di sostegno	3 g																													
31	Rivestimento in pannelli di fibrocemento	1 g																													
32	Posa in opera di scossaline	1 g																													
33	6. Sistemazioni generali	5 g																													
34	Realizzazione pavimentazione esterna di collegamento	4 g																													
35	Posa di erba in zolle	1 g																													
36	7. Smobilizzo dell'area di cantiere	5 g																													
37	Pulizia e smobilizzo dell'area di cantiere	5 g																													
