


N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	16/03/2020	17/03/2020	1
2	B	Preparazione cantiere	16/03/2020	18/03/2020	2
3	C	Ponteggi - Protezioni	18/03/2020	07/04/2020	20
4	D	Intervento Solaio Copertura	30/03/2020	09/05/2020	40
5	E	Sistemazione Crollo Timpano	07/05/2020	12/05/2020	5
6	F	Tamponature murature crollate	11/05/2020	31/05/2020	20
7	G	Cinturazioni Facciate	25/05/2020	24/06/2020	30
8	H	Puntellature e Sbatacchiatura Aperture	22/06/2020	07/07/2020	15
9	I	Pulizie e smobilizzo	07/07/2020	09/07/2020	2
10	L	Fine lavori	09/07/2020	10/07/2020	1

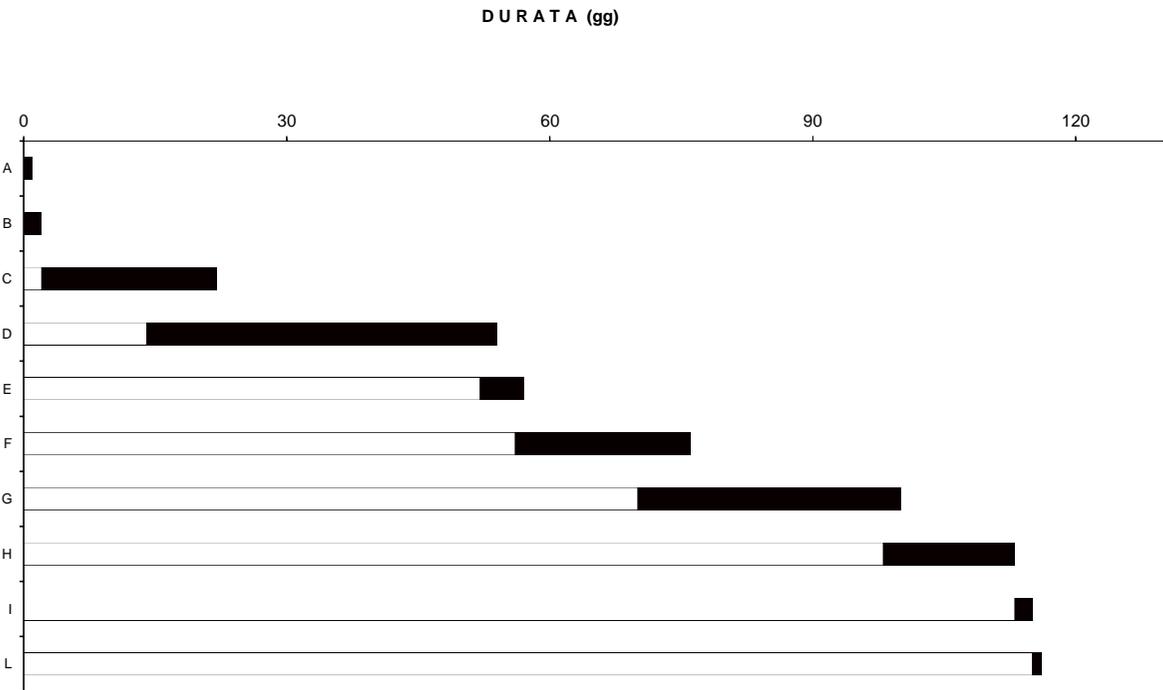

Inizio dei lavori
0 gg

Fine lavori
116 gg

TC

116 gg.
naturali consecutivi

N.B. le date di inizio e fine sono indicative risultando vincolate al rilascio dei necessari Atti autorizzativi di merito
