



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N. 119	DATA 27-08- 2018	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. 4/2018/PA Ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. , con sede in Roma , via Odoardo Beccari n. 103 P. IVA 13165251003 per lavori di manutenzione strade comunali nelle frazioni Cepparo, Colle Viglia e Campigliano: posa in opera di conglomerato bituminoso. CIG: ZB520BDD42
-----------	------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti Responsabile del Settore Tecnico;

Dato atto che l'Ufficio Tecnico Comunale nel corso dell'anno 2017 ha redatto un progetto per il ripristino della pavimentazione in asfalto nelle strade comunali che conducono alla Fraz. Cepparo, Loc. Campigliano e Loc. Colle Viglia;

Dato atto che il Quadro Tecnico Economico dell'opera risultava il seguente:

LAVORI	€ 24.410,00
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 732,30
TOTALE LAVORI	€ 25.142,30
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% SU LAVORI	€ 5.531,31
IMPREVISTI	€ 323,55
SPESE PROGETTAZIONE E DL. (COMPRESI ONERI E IVA)	€ 502,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.657,70
TOTALE LAVORI	€ 31.500,00

Vista la Determina n° 175 del 18/12/2017 con la quale si incaricava la ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Roma, via Odoardo Beccari n. 103, P. IVA 13165251003, dell'esecuzione della manutenzione dei tratti stradali sopra citati con fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso al prezzo offerto di € 30.500,00 comprensivo di IVA e si impegnava la pari

somma al Cap. 109334 art 1 codice "Acquisto servizi per manutenzione territorio", che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza 2017;

Vista la relazione di sopralluogo del 05/05/2018 prot. n.1848, con allegata documentazione fotografica, redatta dal Responsabile del Settore di Polizia Locale, Isp. Capo Leonardi Antonio, inerente all'esecuzione delle opere;

Vista la relazione inerente alla contabilità dei lavori redatta dal Geom. Egidio Damiani, Istruttore Tecnico del Comune di Rivodutri, in data 13.08.2018 prot. n. 3262/2018;

Vista la fattura n° 4/2018/PA del 18/04/2018 assunta al prot. 1609 del 19/04/2018 presentata dalla Ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Roma, via Odoardo Beccari n. 103, P. IVA 13165251003, dell'importo di € 25.000,00 oltre IVA 22% pari ad € 5.500,00 per un complessivo di € 30.500,00;

Visto il Durc attestante la regolarità contributiva della ditta;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

Visto il bilancio di previsione approvato con Deliberazione di C.C. n.07 del 09.04.2018;

Vista la variazione al bilancio di previsione approvata con Deliberazione di G.C. n.50 del 06.08.2018;

Vista la L. 102/2009;

Visto l'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.2011, inerente al patto di stabilità interno degli enti locali;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2017;

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n°267 del 18.08.2000;

Visto l'art.184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n°267 del 18.08.2000;


D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono tutte riportate;
2. **Di liquidare** la fattura n° 4/2018/PA del 18/04/2018 assunta al prot. 1609 del 19/04/2018 presentata dalla Ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Roma, via Odoardo Beccari n. 103, P. IVA 13165251003, dell'importo di € 25.000,00 oltre IVA 22% pari ad € 5.500,00 per un complessivo di € 30.500,00;
3. **Di trasmettere** ai sensi del 4° comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio di

Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento.

Rivodutri, lì **27-08-2018**

Il Responsabile del Servizio
Claudio Arch. Mozzetti



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Mozzetti".

Provvedimento N. 591 del 28.8.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(~~Lodovico Lombardi~~)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the official in charge mentioned in the stamp below.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower-left quadrant of the page.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12470419	Data richiesta	17/07/2018	Scadenza validità	14/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARES COSTRUZIONI GENERALI SRL
Codice fiscale	13165251003
Sede legale	VIA LEON PANCALDO, 50 00147 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002165899

Identificativo Pagamento: 4/2018/PA

Importo: 25000,00 €

Codice Fiscale: 13165251003

Data Inserimento: 28/08/2018 - 9:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RICOM0009

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI RIVODUTRI





COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Piazza Municipio n. 9
C.A.P. 02010
Tel. 0746 685612
Telefax 0746 685485
C.F. 00108820572
Mail: tecnico@comune.rivodutri.ri.it

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 3262 / 2018

RELAZIONE a corredo della contabilità dei lavori di manutenzione ordinaria delle seguenti strade:

- a) Cepparo
- b) Campigliano
- c) Colle Viglia

-Premesso che con determina dell'ufficio tecnico n. 175 del 18.12.2017, è stato affidato alla Ditta Ares Costruzioni Generali s.r.l. l'incarico di realizzare i lavori di manutenzione della pavimentazione nelle predette strade;

-Eseguite le necessarie misurazioni di riscontro si ha la seguente

CONTABILITA' LAVORI:

- a) Cepparo - ml 280,00 x 6,50 = mq 1.820,00
- b) Campigliano -
 - 1) 10,80 x 1,20 x 1/2 = mq 10,86
 - 2) 13,90 x 3,00 = mq 41,70
 - 3) 54,70 x 4,00 = mq 218,80
 - 4) 14,50 x 3,80 = mq 55,10
 - 5) 159,00 x 3,80 = mq 604,20
 - Totale mq 930,66
- c) Colle Viglia - ml 220,00 x 4,00 = ml 880,00

COMPLESSIVAMENTE : mq 1.820,00 + 930,66 + 880,00= mq 3.630,66

Quindi : mq 3.630,66 x €/mq 6,58 (offerta) = €. 23.889,74

più i.v.a. al 22% = €. 29.145,48

La sviluppata contabilità non comprende il costo del conglomerato bituminoso prelevato dagli operai comunali per gli interventi di riparazione della pavimentazione stradale eseguita in proprio su: via Micheli Gabriele, via Santa Maria, via Villa Capita, via del Prato, via Cepparo, (interventi accertati dal Responsabile del Servizio della Polizia Locale con propria relazione del 05.05.2018, prot. n. 1848).

Stante la fattura n. 4/2018/p.a. pari ad €. 25.000,00 al netto dell'i.v.a. , l'importo di detto materiale assommerebbe ad €. 1.100,26, più i.v.a.


Considerato che il costo del conglomerato bituminoso a piè d'opera, sulla base ed in proporzione del prezzo offerto dall'impresa compresa stesura, ed in considerazione della modesta quantità fornita, può avere un importo medio di 185,00 €/mc.

Stante che l'operaio Sampalmieri Giuliano dichiara, con la sottoscrizione del presente documento contabile, di aver prelevato personalmente con benna dell'escavatore di proprietà del comune mc 6,00 di materiale bituminoso per l'esecuzione delle riparazioni predette, si ha: mc 6,00 x €/mc 185,00= €. 1.110,00.

Pertanto : €. 23.889,74 + 1.110,00 = €. 24.999,74 che si arrotonda ad €. 25.000,00 + i.v.a. al 22% = €. 30.500,00.

Rivodutri, li 13.08.18

l'operaio Sampalmieri Giuliano



Geom. Egidio Damiani





COMUNE DI RIVODUTRI

C.A.P. 02010

Provincia di Rieti

Tel 0746685612

C.F.00108820572

Piazza Municipio 9

Telefax 0746685485

vigili@comune.rivodutri.ri.it PEC comune.rivodutri@legalmail.it

POLIZIA LOCALE

Prot. n.1848

del 05.05.2018

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Rivodutri

Oggetto: Relazione di sopralluogo presso le strade comunali nelle quali sono stati eseguiti i lavori di posa in opera di conglomerato bituminoso.

Premesso che, sono stato incaricato dal Vice Sindaco di assistere ai fini della viabilità, il cantiere mobile della Ditta incaricata dall'Ente, per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso nelle strade comunali, e per i tratti già individuati e accertare altresì la quantità del bitume fornito e posto in opera;

Dato atto che, dal 12 al 16 Aprile sono stati eseguiti dalla Ditta i lavori di fornitura del conglomerato bituminoso e posto in opera con l'ausilio di macchina finitrice, previo spruzzamento di emulsione bituminosa, e successiva compressione con rullo, per dare uno spessore bitumato mediamente di cm.3, per un complessivo di mq. 3920 suddiviso e quantificato come segue:

- Via Cepparo lunghezza ml.280 larg. Ml.7,5 mq. 2100
- Via Colle Viglia lunghezza ml.220 larg. Ml.4,0 mq. 880
- Via Campigliano lunghezza ml.235 larg. Ml.4,0 mq. 940

Inoltre sono state eseguite parziali risagomature del manto stradale nelle strade comunali di Via Campigliano e Vicenna.

Sono stati prelevati dai nostri operai e caricato sulla nostra terna gommata, circa mq. 3 di materiale bituminoso per interventi di riparazione del manto stradale deteriorato in Via Micheli Gabriele, Via Santa Maria, Via di Villa Capita, Via del Prato, Via Cepparo;


CONCLUSIONI:

Stato quanto sopra descritto e dichiarato e per quanto di mia competenza, quale incaricato dal Sig. Vice Sindaco di fare osservare gli ordini impartiti e di vigilare sul buon andamento dei lavori, posso personalmente affermare che l'intervento di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, è stato eseguito dalla Ditta incaricata, con ottima competenza e professionalità degli operatori, con adeguatezza di personale, mezzi e attrezzatura. L'intervento non ha avuto opposizione o segnalazioni di contestazioni, o di danni da parte di privati cittadini.

Ad ogni buon fine si allega adeguata documentazione fotografica degli interventi.

Il Responsabile del Servizio
Ispettore Capo Antonio LEONARDI



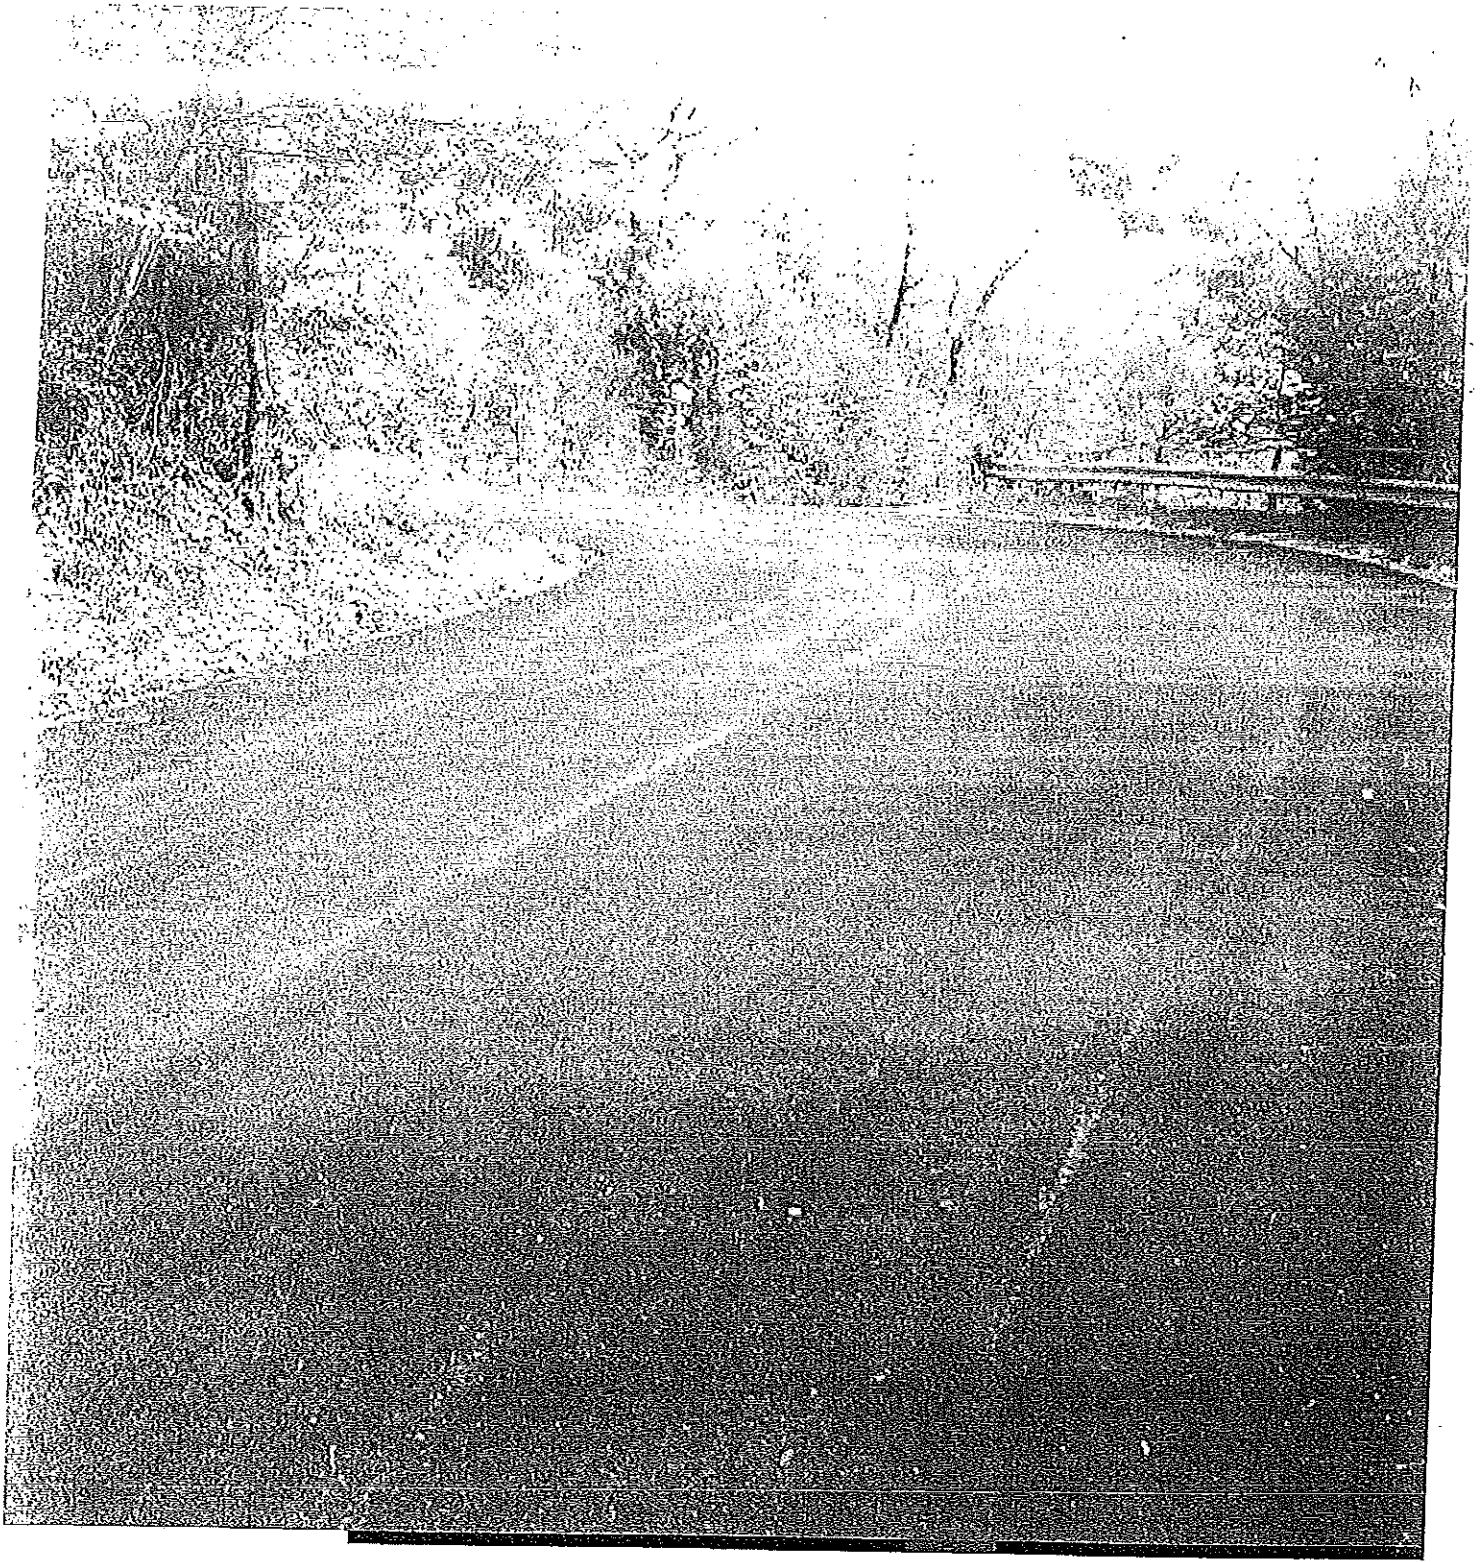


CEPPARO



CEPPARO




CETPA RO

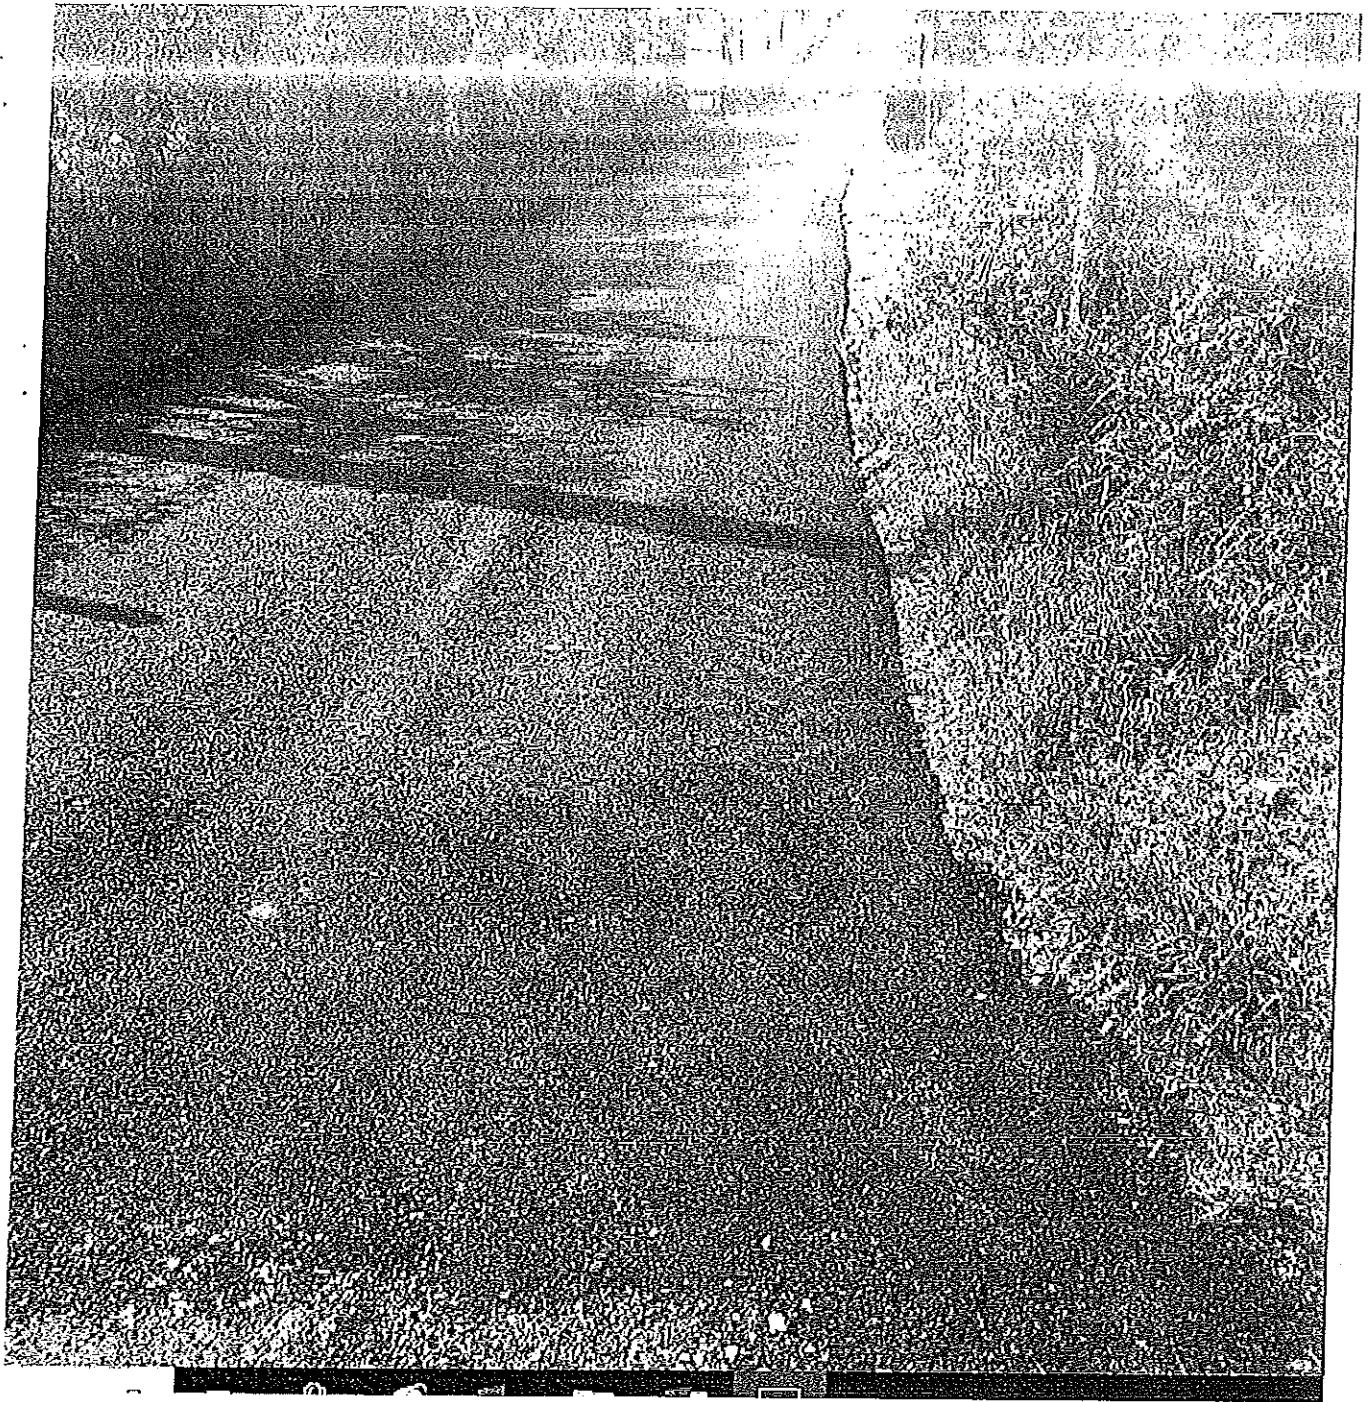

Colle Viglia



CAMPIGNANO

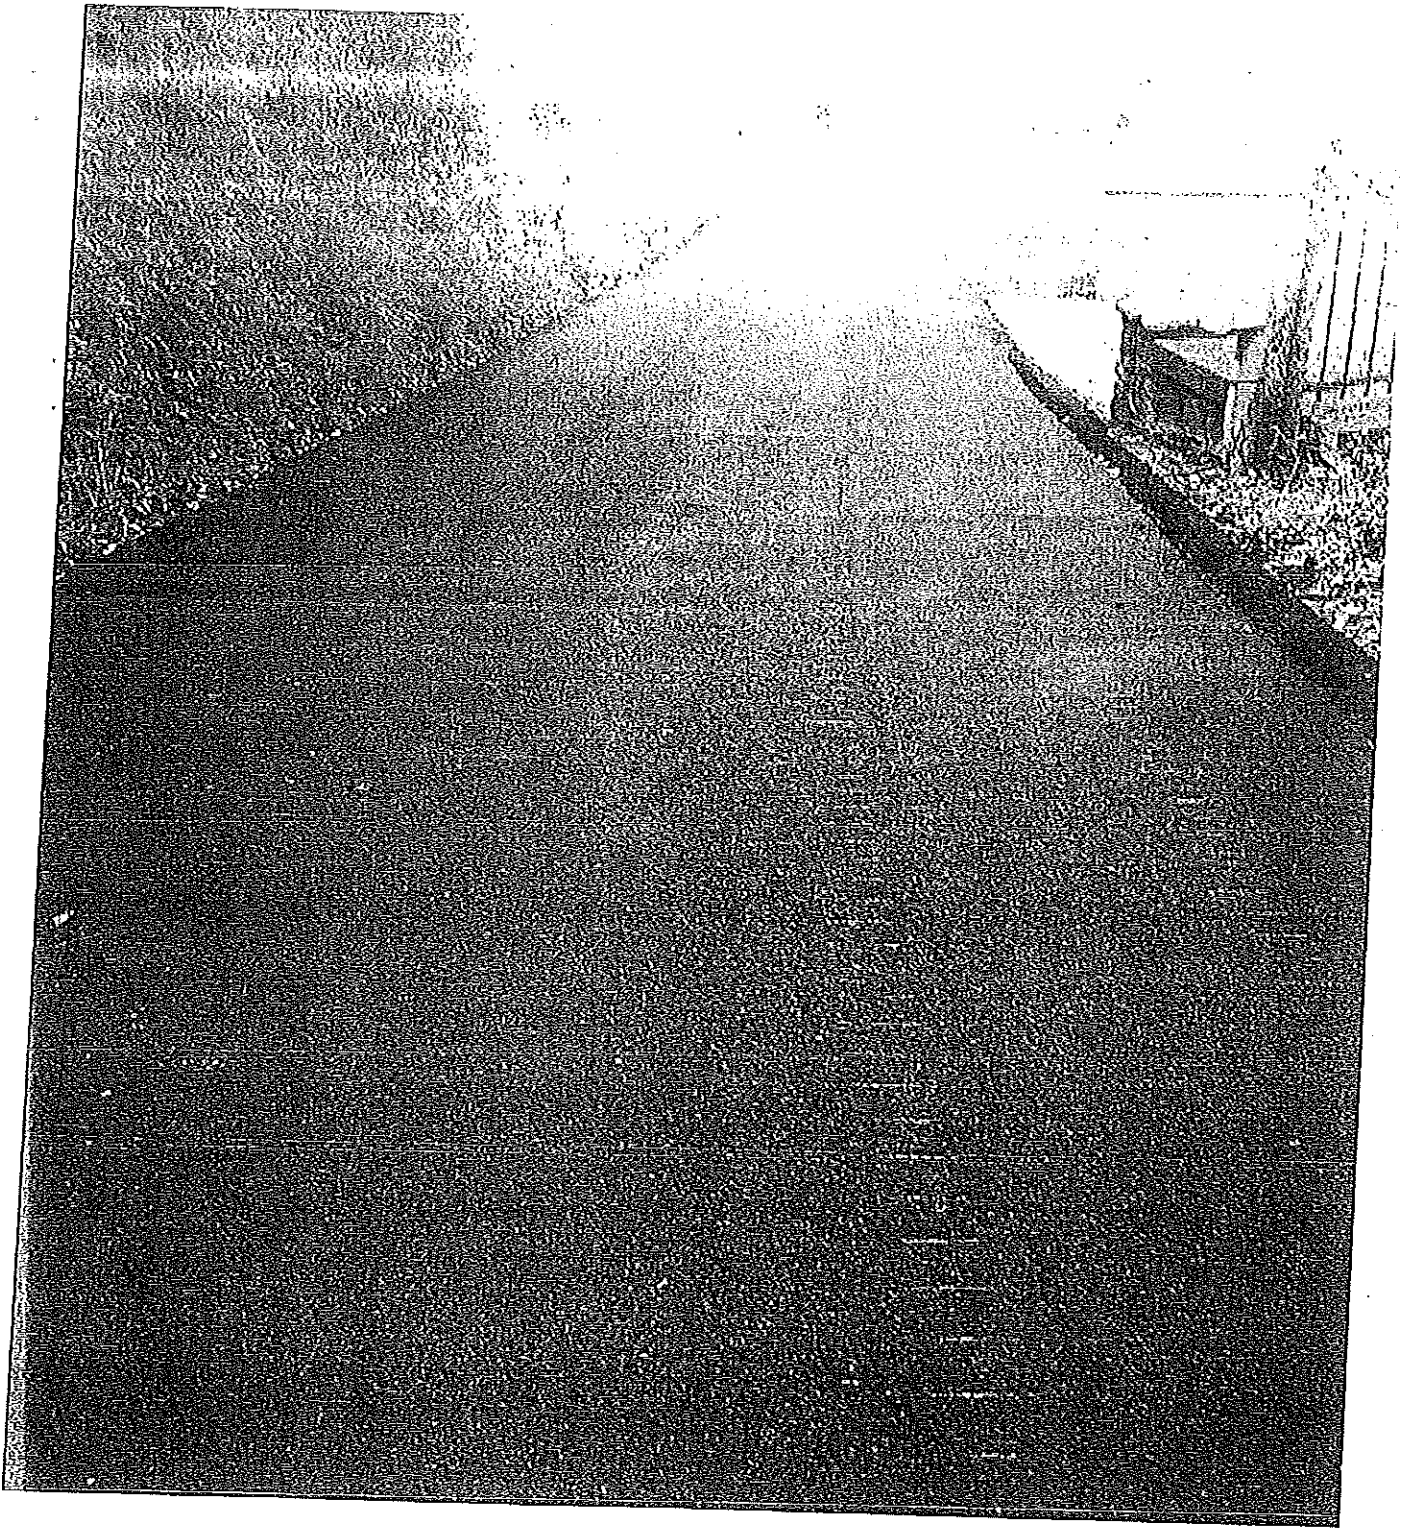

CAMPIGNANO



CAMPIGNANO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004329360
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13165251003
Codice fiscale: 13165251003
Denominazione: Ares Costruzioni Generali S.r.l
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Leon Pancaldo, 50
CAP: 00147
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 1427622
Capitale sociale: 1000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00108820572
Codice Fiscale: 00108820572
Denominazione: COMUNE DI RIVODUTRI

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 9
CAP: 02010
Comune: RIVODUTRI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sol www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-04-18 (18 Aprile 2018)
Numero documento: 4/2018/PA
Importo totale documento: 30500.00
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 175
Data ordine di acquisto: 2017-12-18 (18 Dicembre 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB520BDD42

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavori di manutenzione straordinaria - Posa in opera di conglomerato bituminoso in alcuni tratti di strade comunali a Cepparo, Colle Viglia e Campigliano.
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 25000.00000000
Valore totale: 25000.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 25000.00
Totale imposta: 5500.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)


Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 25000.00
Istituto finanziario: Banca Popolare di Sondrio
Codice IBAN: IT57G0569603202000009234X00
Codice ABI: 05696
Codice CAB: 03202

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale: www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-08-18 pos. n° 273

Rivodutri li 30-08-2018

IL MESSO COMUNALE

