



REGIONE
LAZIO



REGIONE LAZIO

COMUNE DI AMATRICE

PROTEZIONE CIVILE



GRUPPO TECNICO DI VERIFICA (GTV)

per la verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post-sisma dei
manufatti edilizi



VERBALE DI SOPRALLUOGO DELLA FRAZIONE DI SOMMATI



Il giorno **20** (venti), del mese di **Dicembre** dell'anno **2019** a seguito della convocazione del COI, alle ore 11:00, sono convenuti presso la frazione Sommati:

- per il COI: P.I. Armando Bartolelli;
- per la Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini;
- per il Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera;
- il Coordinatore per la sicurezza: Arch. Raybaudi Massilia Stefano;
- per l'Impresa Esecutrice G.A.R.C. spa: Tecnico di Cantiere Cipriani Dino;

per costituire il **GTV** (Gruppo Tecnico di Verifica) e procedere, quindi, alla verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post sisma dei manufatti edilizi nella frazione Sommati a seguito degli interventi proposti dal **GTS** (Gruppo Tecnico di Sostegno) ed eseguiti dai vari

[Handwritten signatures in blue ink]

Comune di Amatrice
Arrivo

Prot. N. 0000506 del 14-01-2020
Ufficio UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



Soggetti Attuatori di cui all'ocdpc n. 393 del 13.09.2016, previa adozione di specifiche ordinanze sindacali.

Si premette che la frazione Sommati **é** stata perimetrata quale zona rossa con Ord. 30 del 01.09.2016.

A seguito di verifica ispettiva in data odierna:

- si rileva che sono state eseguite le demolizioni relative ai fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 302, 303, 528, 532, 633, 283, 284, 287, 289, 337, 307, 308, 727, 265, 266, 268, 270, 273, 274, 276, 278, 281, 282, 313, 314, 315, 351, 352, 353, 355, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 602, 459, 338, 332, 333, 334, 335, 336, 327, 328, 329, 330, 331, 316, 324, 325, 326, 358, 360, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 538, 239, 240, 540, 171, 462, 172, 6, 7/parte, 29, 38, 73, 74, 76 (no sub. 2), 78, 79, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 31, 67, 714, 374, 562, 224, 204, 205, 208, 207, 731, 217, 200, 225, 226, 227, 228, 117, 118, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 107, 108, 88, 89, 90, 36, 733, 709, 190, 202, 133, 231, 232, 477, 191, 192, 196, 195, 199, 153, 152, 150, 149, 148, 146, 742, 145, 132, 131, 116, 479, 252, 253, 19 sub. 10, 565, 75, fg. 36 p.lle 252, 567, 203, fg. 62 p.lle 70, 71, 176 con macerie rimosse secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie;
- si rileva che è stata eseguita la demolizione relativa al fabbricato distinto al fg. 63 p.lle 397 secondo l'ordinanza 273 del 13.12.2016 dove la particella indicata è la n. 367 mentre il

GTS di riferimento individua la p.lla 397 da demolire e i soggetti indicati nell'ordinanza sono proprietari della p.lla 397;

- si rileva che sono state rimosse le macerie dei fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 163, 164 (acquisito dissequestro), 165, 166, 478, 737, 34, 711, 119, 142, 143, 144, 141, fg. 62 p.lla 201 sub. 3, fg. 36 p.lla 567;
- si rileva che risultano ancora da demolire i fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 7/parte, 8, 9 in quanto strutturalmente connessi alla p.lla 10 oggetto di prescrizioni MIBAC e per lo stesso motivo sono state demolite ma non sono state rimosse le macerie dei fabbricati corrispondenti alle p.lle 11, 12, 13;
- si rileva che risulta ancora da demolire il fabbricato distinto al fg. 63 p.lla 716;
- si rileva che risultano ancora da demolire con la procedura "demolizione accorta" i fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 10, 356, 357 contenuti nell'ord. 213 del 7.11.2019 in quanto oggetto di prescrizioni MiBAC;
- si rileva non è stata eseguita la demolizione del fabbricato distinto al fg. 63 ex p.lla 41, nuova p.lla 42/parte oggetto dell'ord. n. 119 del 12/03/2018 in quanto trattasi di struttura unitaria in c.a. che comprende tutta la p.lla 42 indicata come in mappa;
- si rileva che risultano ancora rimuovere le macerie del fabbricato distinto al fg. 63 p.lla 245 per il quale è stato acquisito il dissequestro dal Comune di Amatrice con Prot.



16327 del 04/12/2019;

- si rileva che risultano ancora rimuovere le macerie del fabbricato distinto al fg. 63 p.lla 30 per il quale non è stato acquisito il dissequestro;
- si rileva che risultano ancora rimuovere le macerie dei fabbricati distinti al fg. 36 p.lle 253, 285, 582 per i quali il costo della rimozione delle macerie è stato inserito nella richiesta di contributo di ricostruzione corrispondente alla pratica MUDE ID 6045, in corso di istruttoria;
- si rileva che sono stati demoliti in accordo all'Ord. n. 270 del 13/12/2016 ma risultano ancora rimuovere le macerie dei fabbricati distinti al fg. 62 p.lle 43, 79, 80 in quanto l'ordinanza è relativa alla sola demolizione;
- si rilevano eseguite le opere provvisorie disposte sul fabbricato distinto al fg. 63 p.lla A (Chiesa di S. Egidio);
- si rilevano come da eseguire le opere provvisorie disposte sul fabbricato distinto al fg. 36 p.lla A (Chiesa S. Pietro);
- si rileva la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità in corrispondenza dei fabbricati distinti al foglio 63 particelle 137 e 139 che non sono stati oggetto di precedenti GTS;
- si rileva la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità in corrispondenza del fabbricato distinto al foglio 63 particella 14 che non è stato oggetto di precedenti GTS;
- si dà atto che l'intervento di demolizione parziale disposto con Ord. 214 del 30/11/2016 sul fabbricato distinto al fg. 62

p.lla 131, ovvero la demolizione della parte fronte strada dell'edificio eseguita dai VV.FF. non è sufficiente per rimuovere il pericolo per la pubblica incolumità e non è possibile procedere in sicurezza alla rimozione delle macerie e che per il fabbricato in oggetto è stata presentata la richiesta di contributo di ricostruzione corrispondente alla pratica MUDE ID 3184, in corso di istruttoria;

Per le motivazioni che precedono;

questo GTV

PROPONE

- di rettificare l'ord. n. 273 del 13.12.2016 nel senso di correggere l'ordinanza indicando la p.lla 397 in sostituzione della p.lla 367 erroneamente riportata;
- di eseguire le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, dei fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 7/parte, 8,9,716;
- di eseguire le operazioni rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, dei fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 11,12,13;
- di procedere in adempimento a quanto disposto dall' ord. 213 del 7.11.2019 e secondo i dettami delle direttive emanate



a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, con gli interventi previsti (demolizione accorta) sui fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 10, 356, 357;

- di rettificare l'ord. n. 119 del 12/03/2018 escludendo il fabbricato distinto al fg. 63 p.la ex 41 (nuova p.la 42) in quanto struttura in c.a. (come da foto allegate);
- di eseguire le operazioni di rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, del fabbricato distinto al fg. 63 p.la 245 per il quale è stato acquisito il dissequestro dal Comune di Amatrice con Prot. 16327 del 04/12/2019;
- di attendere il dissequestro per la rimozione delle macerie del fabbricato distinto al fg. 63 p.la 30;
- di transennare l'area prospiciente i fabbricati distinti al fg. 36 p.lle 253, 285, 582 per i quali è stata eseguita la demolizione e senza rimozione macerie in quanto il costo è stato inserito nella richiesta di contributo (ID MUDE 6045) e si rimanda alla verifica dell'ammissibilità dello stesso per la rimozione delle macerie in fase successiva;
- di eseguire le operazioni rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, dei fabbricati distinti al fg. 62 p.lle 43, 79, 80 previa

pubblicazione di apposito avviso;

- di procedere con l'intervento di messa in sicurezza sul fabbricato distinto al fg. 36 p.lla A (Chiesa S.Pietro);
- di estendere le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, ai fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 137 e 139 previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale, trattandosi di:

"Edifici isolati realizzati in muratura in pietra arenaria e legante di scarsa qualità, privo di incatenamenti visibili in facciata, tetto in legno. Da apposito sopralluogo è stato rilevato un severo grado di danno, con crolli parziali e con lesioni passanti estese sulle murature portanti, condizione che determina grave pericolo per la pubblica incolumità";

- di estendere le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, al fabbricato distinto al fg. 63 p.lla 14 previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale, trattandosi di:

"Edificio in aggregato con parte di edifici già demoliti (ord.115 del 12.03.2018 che ordina la demolizione degli edifici distinti alle p.lle 6-7-8-9-10-11-12-13) si sviluppa su due livelli, realizzato in muratura in pietra arenaria e legante di scarsa qualità, privo di incatenamenti



visibili in facciata. Da apposito sopralluogo è stato rilevato un severo grado di danno, con lesioni passanti estese sulle murature portanti, condizione che determina grave pericolo per la pubblica incolumità";

- di estendere le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie, previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale, secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, all'intero fabbricato distinto al fg. 62 p.lla 131, in quanto la demolizione parziale dello stesso non assicura la stabilità strutturale della rimanente parte e la rimozione del pericolo per la pubblica incolumità, dato atto che è stata presentata domanda di contributo per la ricostruzione dell'edificio con riferimento MUDE ID 3184; si precisa che trattasi di:

"edificio di n. 2 piani fuori terra e 1 seminterrato. La struttura è al piano terra in muratura a sacco e nel piano superiore in blocchi di calcestruzzo e tetto in c.a. Si presenta con il muro al piano terra completamente crollato con lesioni a X, spancamenti e rotazioni degli angoli."

Più segnatamente, questo GTV

RITIENE

che il raggiungimento delle condizioni di recupero della transitabilità e/o fruibilità del centro abitato in epigrafe e delle infrastrutture varie

sia subordinato all'esecuzione dei prescritti interventi;

ACCERTA

che il superamento, in via generale, delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES possa essere certificato all'esito dei prescritti interventi;

PROPONE

la rimozione della zona rossa, previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale, essendo stati realizzati nella stessa tutti gli interventi proposti dal **GTS** (Gruppo Tecnico di Sostegno) ed eseguiti dai vari Soggetti Attuatori di cui all'ocdpc n. 393 del 13.09.2016;

PRESCRIVE

tuttavia i seguenti adempimenti, da eseguirsi successivamente ai prescritti interventi, al fine di restituire una agibilità integrale agli edifici esitati "A" insistenti sulla detta frazione:

- La completa rimozione del materiale di risulta dalle operazioni di demolizione e rimozione macerie eseguite (ligneo, ferroso etc.) nonché delle bombole di gas;
- Verifica di funzionalità delle reti e dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia);
- Il ripristino delle delimitazioni delle aree di sedime dei fabbricati demoliti poste in opera dalla Ditta Appaltatrice;
- Sistemazione del manto stradale;

Handwritten signatures in blue and black ink, located on the right margin of the document. There are four distinct signatures, with the top two in blue and the bottom two in black.

- All'esito delle effettuate prescrizioni emanate con il presente provvedimento l'apposizione di idonea segnaletica per la segnalazione di eventuali pericoli.

Si allega al presente verbale:

1) Un estratto di mappa catastale recante:

- a) i fabbricati demoliti e/o macerie rimosse;
- b) i fabbricati con messa in sicurezza eseguita;
- c) il fabbricato da demolire oggetto del presente GTV;
- d) i fabbricati da demolire con demolizione accorta (MIBAC);
- e) i fabbricati con macerie da rimuovere e sottoposti a sequestro;
- f) i fabbricati con macerie da rimuovere in quanto comunicato dissequestro;
- g) i fabbricati da demolire;
- h) i fabbricati con macerie da rimuovere;
- i) i fabbricati con messa in sicurezza da realizzare.

2) Report recante gli atti amministrativi emanati (elenco ordinanze di demolizione e rimozione macerie frazione Sommati – mappa zona rossa).

Redatto il presente verbale, cinque copie, previa lettura e conferma, il GTV si chiude alle ore 13:30 e viene sottoscritto dagli intervenuti.

COI: P.I. Armando Bartolelli

Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini

Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera

Coordinatore per la sicurezza: Arch. Raybaudi Massilia Stefano;

Tecnico di Cantiere Impresa Esecutrice G.A.R.C. spa: Cipriani Dino.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a signature below it, and two signatures on the right side of the page.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL FABBRICATO DISTINTO
AL FG. 63 P.LLA 42 (EX P.LLA 41) – NON DEMOLITO



Re
J
L
Lu
Lu
B
t

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI FABBRICATI DA
DEMOLIRE A SEGUITO DEL PRESENTE GTV

Fg. 63 p.lla 137



23/11/2011

fr

fr



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "A. B. L. S." or similar.

Fg. 63 p.lla 139



Pa
da
la
a

Fg. 63 p.lla 14



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "B. Z. Lm".



for
for
for

Fg. 62 p.lla 131



Handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a checkmark-like symbol.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "R. J. R."

SOMMATI (Fg.63)**ALLEGATO 1 - GTV 20/12/2019****LEGENDA**

- Demolizione e/o rimozione macerie eseguita
- Messa in sicurezza eseguita
- Demolizione disposta con presente GTV
- Demolizione accorta da fare (MIBAC)
- Rimozione macerie con sequestro
- Rimozione macerie da fare con dissequestro
- Demolizione da fare
- Rimozione macerie da fare
- Messa in sicurezza da fare



N=42800

E=-11100

1 Particella: 240

Scala originale: 1:1000
 Dimensione cornice: 388.000 x 276.000 metri
 Comune: AMATRICE
 Foglio: 63

18-Dic-2019 13:47:24
 Prot. n. T177499/2019

ALLEGATO 2 - GTV 20/12/2019

- Demolizione e/o rimozione macerie eseguita
- Messa in sicurezza eseguita
- Demolizione disposta con presente GTV
- Demolizione accorta da fare (MiBAC)
- Rimozione macerie con sequestro
- Rimozione macerie da fare con dissequestro
- Demolizione da fare
- Rimozione macerie da fare
- Messa in sicurezza da fare



Prot. n. T178259/2019

Dimensione cornice: 388.000 x 276.000 metri

Foglio: 63




SOMMATI (Fig.62)

ALLEGATO 4 - GTV 20/12/2019

LEGENDA

- Demolizione e/o rimozione macerie eseguita
- Messa in sicurezza eseguita
- Demolizione disposta con presente GTV
- Demolizione accorta da fare (MIBAC)
- Rimozione macerie con sequestro
- Rimozione macerie da fare con dissequestro
- Demolizione da fare
- Rimozione macerie da fare
- Messa in sicurezza da fare

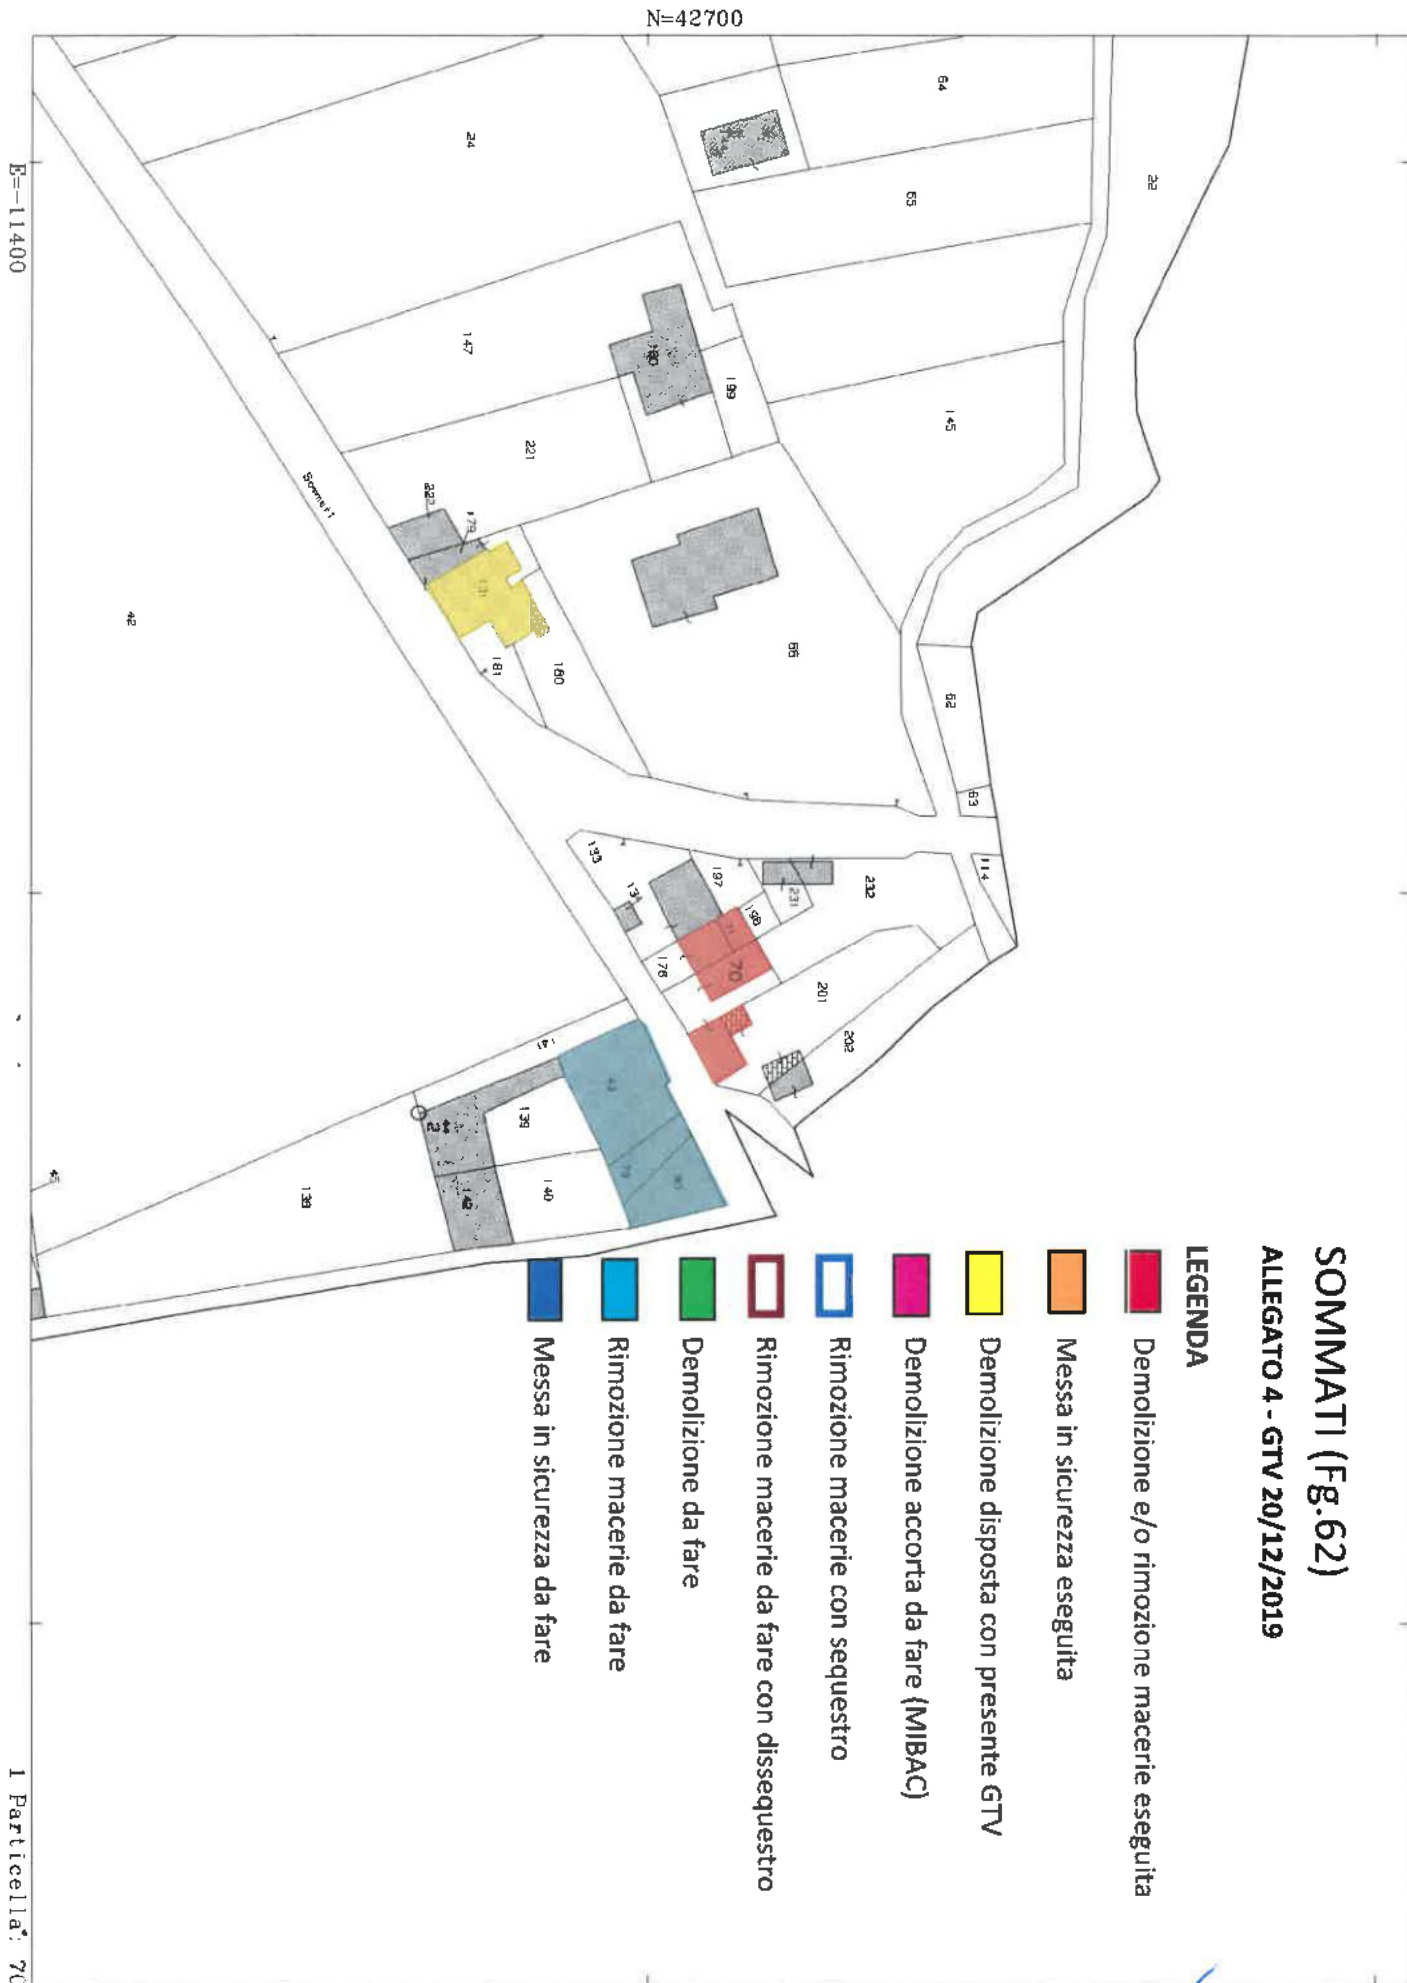

[Handwritten signatures and stamps]

ELENCO ORDINANZE SOMMATI

N° SCHEDA GTS		n. ord.		del		n. prot.		del		TIPOLOGIA		fraseone		fg		mapp.		Mibac		Sequestri		MISAC REVISIONI					
PROG.		FASCICOLO		DEL		n. ord.		del		n. prot.		del		TIPOLOGIA		fraseone		fg		mapp.		Mibac		Sequestri		MISAC REVISIONI	
248		1		04/05/2017				/		/		15/05/2017		13082		27.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		302			
249		2		04/05/2017				318		15/05/2017		13082		27.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		303 - 528 - 552 -		693			
250		3		04/05/2017				319		15/05/2017		13082		27.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		303 - 528 - 552 -		693			
251		4A		04/05/2017				320		15/05/2017		13153		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		283					
252		4B		04/05/2017				321		15/05/2017		13154		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		284					
253		4C		04/05/2017				322		15/05/2017		13163		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		287					
254		4D		04/05/2017				323		15/05/2017		13165		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		289					
255		4E		04/05/2017				324		15/05/2017		13166		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		337					
256		5		04/05/2017				325		15/05/2017		13168		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		307 - 508					
257		6		04/05/2017				326		15/05/2017		13170		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		727					
258		7A		04/05/2017				327		15/05/2017		13171		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		265 - 266					
259		7B		04/05/2017				328		15/05/2017		13174		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		268 - 270					
260		7C		04/05/2017				329		15/05/2017		13175		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		273 - 274					
261		7D		04/05/2017				330		15/05/2017		13176		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		276 - 278					
262		7E		04/05/2017				331		15/05/2017		13177		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		281 - 282					
263		8		04/05/2017				332		15/05/2017		13178		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		313 - 314 - 315					
264		9		04/05/2017				333		15/05/2017		13180		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		351 - 352 - 353 -		355			
265		10A		04/05/2017		n. ord. 201 del 01.06.2018		334		15/05/2017		8104		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		253					
266		10B		04/05/2017				335		15/05/2017		13182		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		256 - 257					
267		10C		04/05/2017				336		15/05/2017		13183		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		258 - 259					
268		10D		04/05/2017				337		15/05/2017		13185		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		260 - 261					
269		10E		04/05/2017				338		15/05/2017		13187		29.05.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		262 - 602					
270		11		05/05/2017		/		/		/		/		/		MESSA IN SICUREZZA		SOMMATI		36		A		A			
308		12		07/06/2017				429		13/06/2017		16156		10.07.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		459					
309		13		07/06/2017				430		13/06/2017		16157		10.07.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		338					
310		14		07/06/2017				431		13/06/2017		16158		10.07.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		332 - 333 - 334 -		335 - 336			
311		15		07/06/2017				432		13/06/2017		16159		10.07.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		327 - 328 - 329					
312		16		07/06/2017				433		13/06/2017		16161		10.07.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		330 - 331					
313		17		07/06/2017				434		13/06/2017		16163		10.07.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		316 - 324 - 325 -		326			
314		18		07/06/2017		435		13/06/2017		16164		16164		10.07.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		356 - 357 - 358		"B" 356, 357 -		DEMOLIZIONE	
315		19		07/06/2017		213		07/11/2019		14936		14936		10.07.2017		DEM. ACCORTA		SOMMATI		63		356-357		Smont. Contr.		ACCORTA 356, 357	
316		20		07/06/2017				436		13/06/2017		16165		10.07.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		360					
317		21		07/06/2017				437		13/06/2017		16166		10.07.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		367 - 368					
318		22		07/06/2017				438		13/06/2017		16168		10.07.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		369 - 370 - 371 -		372 - 538			
319		23		07/06/2017				440		13/06/2017		16169		10.07.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		239 - 240					
348		44		20/06/2017		435		13/06/2017		16168		16169		10.07.2017		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		540 - 171 - 462 -		172			
349		46		20/06/2017		213		07/11/2019		14936		14936		12.03.2018		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - "B" 10 - Smont.		11 - 12 - 13		DEMOLIZIONE ACCORTA	
350		47		20/06/2017				116		12/03/2018		3922		12.03.2018		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		29					
351		48		20/06/2017		118 rettificata con ord.15		117		12/03/2018		3923		12.03.2018		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		73 - 74 - 76 (no		76 sub 2) - 78 -			
352		49		20/06/2017				119		12/03/2018		3925		12.03.2018		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		79					
353		50		20/06/2017				120		12/03/2018		3924		12.03.2018		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		52 - 53 - 55 - 56 -		57 - 60 - 31 - 67 -			
354		24		09/06/2017				168		17/04/2018		5848		18.04.2018		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		374					
355		25		09/06/2017				169		17/04/2018		5850		18.04.2018		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		562					
356		26		09/06/2017				170		17/04/2018		5851		18.04.2018		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		224 - 204 - 205 -		208 - 207 - 731			
357		27		09/06/2017				171		17/04/2018		5852		18.04.2018		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		217					
358		29		09/06/2017				172		17/04/2018		5853		18.04.2018		DEMOLIZIONE		SOMMATI		63		200					



Nucleo TAS VVF
STCS
Zone Rosse Sommati
