


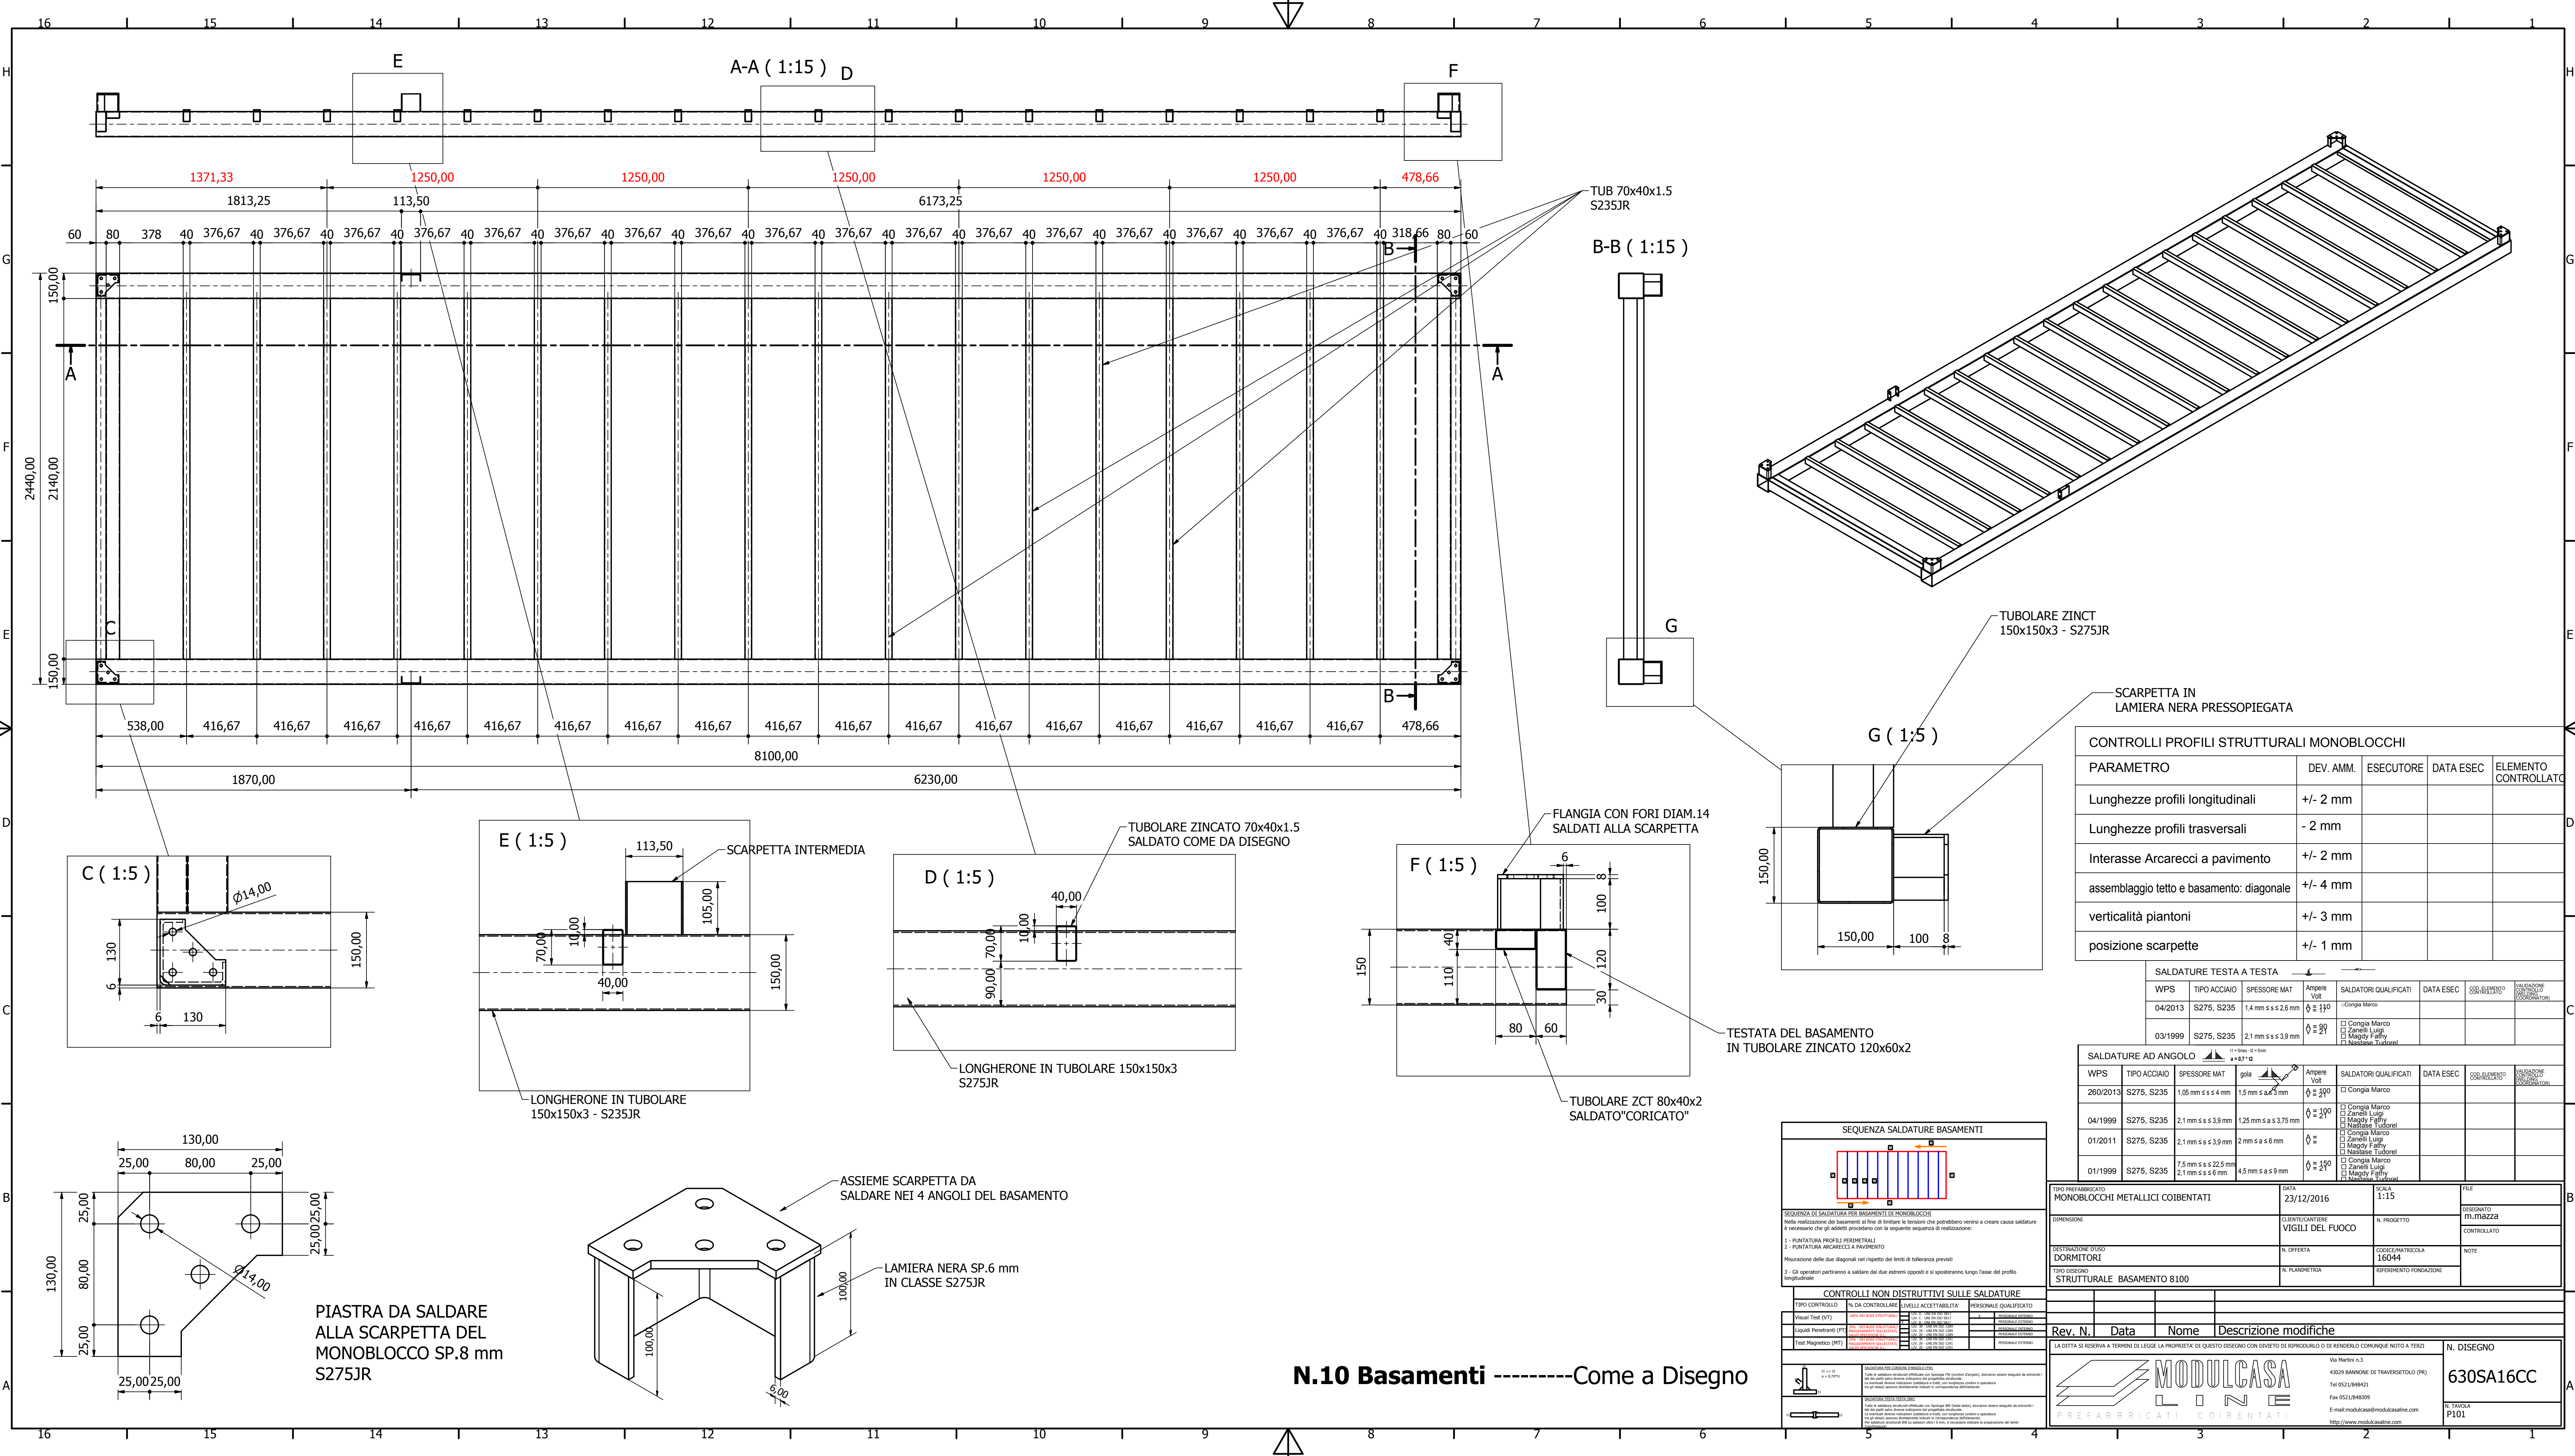

CONTROLLI PROFILI STRUTTURALI MONOBLOCCHI				
PARAMETRO	DEV. AMM.	ESECUTORE	DATA ESEC	ELEMENTO CONTROLLATO
Lunghezze profili longitudinali	+/- 2 mm			
Lunghezze profili trasversali	- 2 mm			
Interasse Arcarecci a pavimento	+/- 2 mm			
assemblaggio tetto e basamento: diagonale	+/- 4 mm			
verticalità pianti	+/- 3 mm			
posizione scarpette	+/- 1 mm			

SALDATURE TESTA A TESTA				
WPS	TIPO ACCIAIO	SPESSORE MAT	Ampere Volt	SALDATORI QUALIFICATI
04/2013	S275, S235	1,4 mm s s 2,6 mm	$\phi \approx 140$	Congia Marco
03/1999	S275, S235	2,1 mm s s 3,9 mm	$\phi \approx 90$	Congia Marco Zanelli Luigi Magdy Fathy Nashabeh Tudorel

SALDATURE AD ANGOLO				
WPS	TIPO ACCIAIO	SPESSORE MAT	gola	Ampere Volt
26/2013	S275, S235	1,05 mm s s 4 mm	1,5 mm s s 4 mm	$\phi \approx 200$
04/1999	S275, S235	2,1 mm s s 3,9 mm	1,25 mm s s 3,75 mm	$\phi \approx 200$
01/2011	S275, S235	2,1 mm s s 3,9 mm	2 mm s s 6 mm	$\phi \approx 200$
01/1999	S275, S235	7,5 mm s s 22,5 mm	4,5 mm s s 9 mm	$\phi \approx 250$

TIPO PREFABBRICATO	DATA	SCALA	FILE
MONOBLOCCHI METALLICI COIBENTATI	23/12/2016	1:15	
DISEGNATO			
m.mazza			
CONTROLLATO			
DESTINAZIONE D'USO	CLIENTE/CANTIERE	N. PROGETTO	NOTE
DORMITORI	VIGILI DEL FUOCO		
STRUTTURALE - BASAMENTO 8100	N. OPERATA	CODICE MATRICOLA	
	N. PLANIMETRIA	16044	
	REFERIMENTO FONDAZIONE		

Rev.	N.	Data	Nome	Descrizione modifiche
LA DITTA SI RISERVA I TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSLO COMUNQUE NOTO A TERZI				
N. DISEGNO				
630SA16CC				
N. TAVOLA				
P101				

MODULCASA

LINE

PREFABBRICATI COIBENTATI

Via Martiri n.3
43029 BANNONE DI TRAVERSETTOLO (PR)
Tel 0521/848421
Fax 0521/848309
E-mail: modulkasa@modulkasaline.com
http://www.modulkasaline.com

N.10 Basamenti -----Come a Disegno
