Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di: "Contributo piccoli investimenti legge bilancio 2019: lavori di manutenzione straordinaria messa in sicurezza patrimonio comunale: asfaltatura venarotta / frazioni"

COMMITTENTE: Comune di Venarotta

IMPRESA: Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio srlu

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Gino Santoni

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
		1	2	1'364,96		2'593,42
	al S.A.L. n. 1			1'364,96		2'593,42
	SOMMANO allo STATO FINALE kg			1'364,96	1,90	2'593,42
2 17.01.012.002	Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con macchina a martello pneumatico.					
		1	8	14,18		24,96
	al S.A.L. n. 1			14,18		24,96
	SOMMANO allo STATO FINALE m			14,18	1,76	24,96
3 18.09.006*.001	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70					
		1	9	2,00		217,04
	al S.A.L. n. 1			2,00		217,04
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			2,00	108,52	217,04
4 19.04.001*	Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino alla profondità di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.					
		1	1	30,40		410,70
	al S.A.L. n. 1			30,40		410,70
	SOMMANO allo STATO FINALE m³			30,40	13,51	410,70
5 19.06.011*.003	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento ... o delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 35 MPA					
		1	3	30,40		4'022,83
	al S.A.L. n. 1			30,40		4'022,83
	SOMMANO allo STATO FINALE m³			30,40	132,33	4'022,83
6 19.13.004.003	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	17	1'118,04		9'693,41
	SOMMANO allo STATO FINALE 100 kg			1'118,04	8,67	9'693,41
7 19.18.004.001	Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e muri di contenimento, eseguito meccanicamente o a mano, compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente					
		1	7	242,00		79,86
		1	14	611,00		201,63
	al S.A.L. n. 1			853,00		281,49
	SOMMANO allo STATO FINALE m			853,00	0,33	281,49
8 19.18.014	Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi. Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi previa getto di acqua da autobotte il cui nolo è compensato a p ... go o altri attrezzi, compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di risulta, della segnaletica regolamentare.					
		1	4	1'214,80		400,88
		1	6	371,00		122,43
		1	11	1'896,30		625,78
		1	13	3'035,00		1'001,55
	al S.A.L. n. 1			6'517,10		2'150,64
	SOMMANO allo STATO FINALE m²			6'517,10	0,33	2'150,64
9 NP02	Rif. Art. 18.06.012 Prezzario Marche 2018 - Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, ... e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di 1^ Cat. - Misurato per ogni m²xcm di tappeto compattato in opera.					
		1	5	4'859,20		11'613,49
		1	10	1'265,00		3'023,35

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
		1	12	7'985,20		19'084,63
		1	15	11'590,00		27'700,10
	al S.A.L. n. 1			25'699,40		61'421,57
	SOMMANO allo STATO FINALE m2*cm			25'699,40	2,39	61'421,57
10 NP03	Rif. Analisi di mercato - Stabilizzazione del sottofondo stradale con cemento tipo 325, mediante passaggio di idonee macchine operatrici con il fine di miscelare il cemento ai mate ... compreso nel prezzo l'impiego dei mezzi d'opera necessari (fresatrice e rullo compattatore) e del materiale occorrente.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	16	726,00		9'997,02
	SOMMANO allo STATO FINALE mq			726,00	13,77	9'997,02
	Parziale LAVORI A MISURA euro					90'813,08
	T O T A L E euro					90'813,08

Data, 05/08/2019
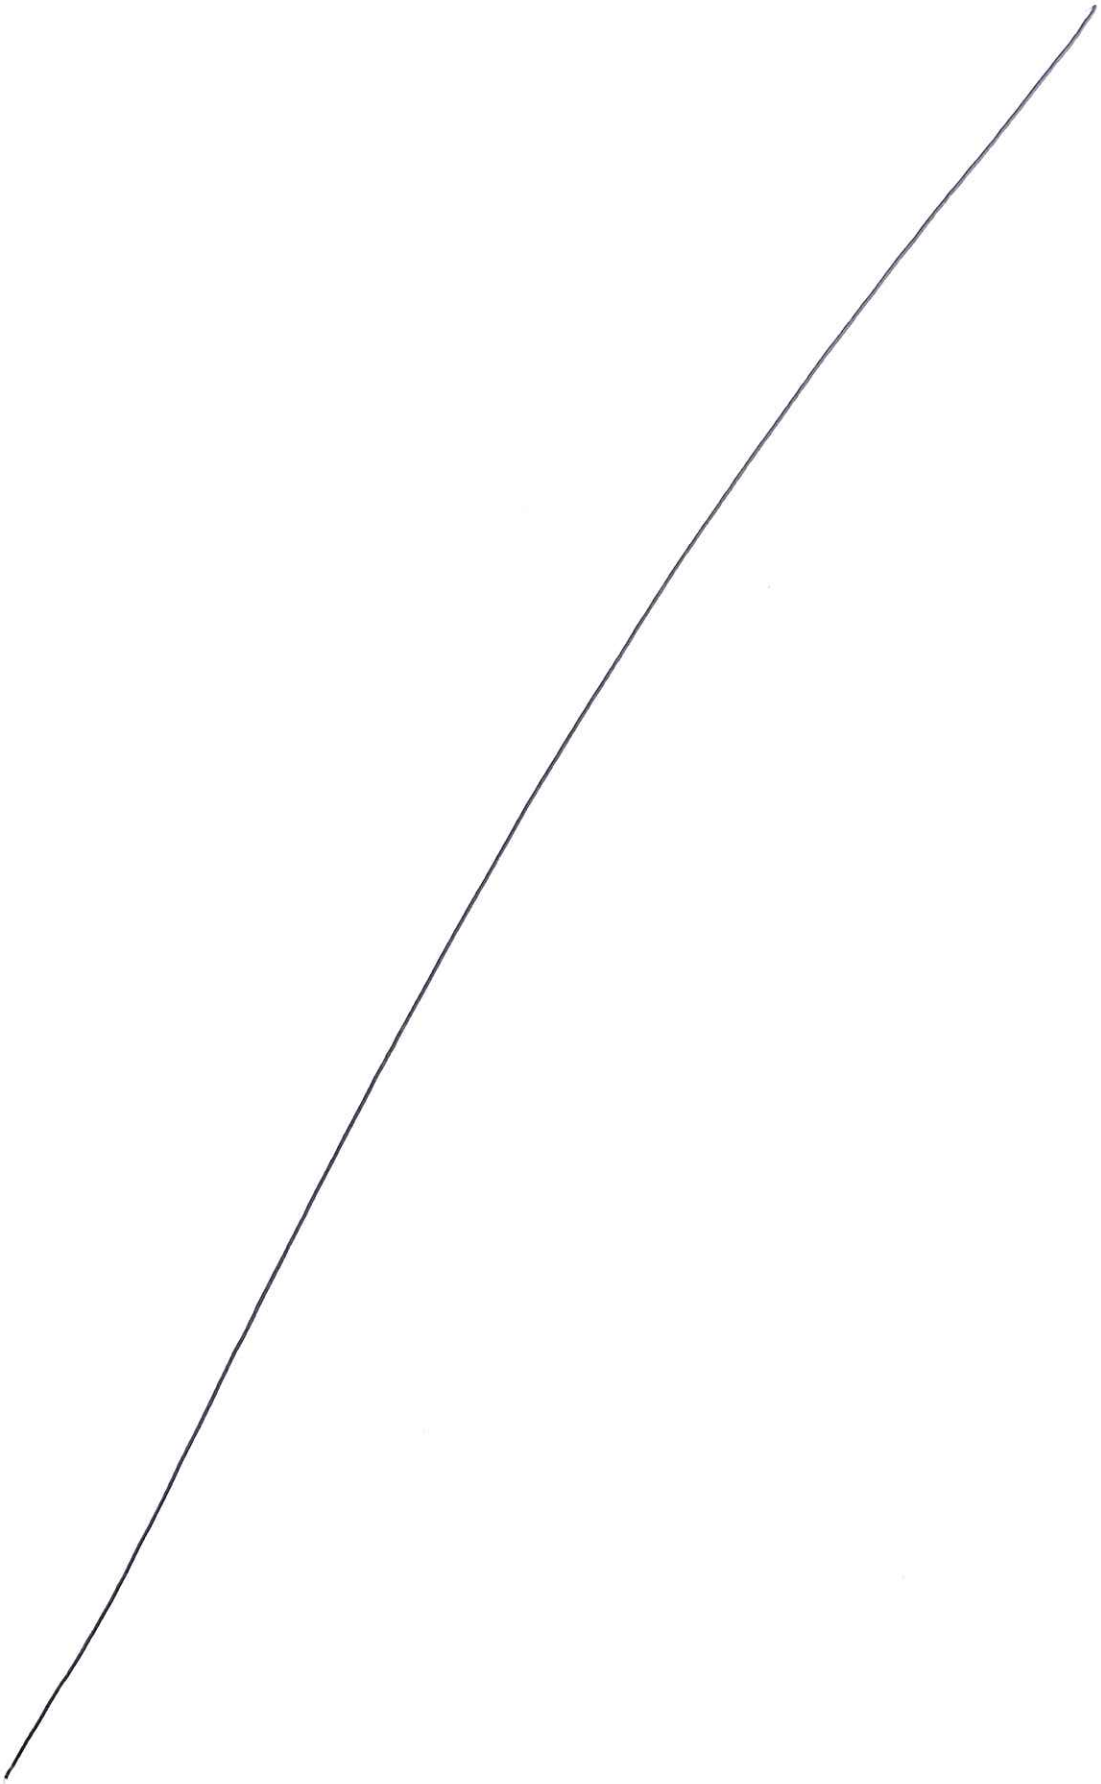
Il Direttore dei Lavori
Geom. Gino Santoni
