COMUNE DI VENAROTTA

Provincia di Ascoli Piceno

Bando GAL PICENO PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013)
Misura 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
Sotto Misura: 19.2.7.2 Operazione A) Riqualificazione dei centri storici e dei borghi

RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO DI GIMIGLIANO

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. F. G. Rapetta

IL PROGETTISTA

Ing. G. Anemone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Gino Santoni

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV	SCALA	DATA 1° EMISSIONE	FILE
NS19006	PE	REL	0010	0	----	Maggio 2020	NS19006PEREL0010.pdf

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
3					
2					
1					

1 PREMESSA

La durata prevista per la realizzazione delle opere di cui al presente progetto è di 120 (Centoventi) giorni naturali e consecutivi.

Il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori, nel dettaglio riportato nel cronoprogramma dei lavori, tiene conto delle particolari condizioni ambientali e delle conseguenti metodologie esecutive che dovranno essere attuate. A solo titolo indicativo, di seguito si riportano una serie di cause che generano perdite di tempo che sono comprese nel periodo sopra indicato:

- impossibilità di eseguire i lavori in modo continuativo a causa dell'andamento meteorologico e della presenza di accessi alle abitazioni all'interno della zona abitata;
- predisposizione di accurate protezioni e passerelle nelle zone che dovranno essere lasciate accessibili agli abitanti.

Non sono comprese nel tempo sopra stimato tutte le interruzioni per causa di forza maggiore cosi come previsto dalla normativa vigente che comportano il fermo completo delle attività ovvero il fermo parziale delle stesse tale che sia impedito il proficuo sviluppo dei lavori.

COMUNE DI VENAROTTA -AP-
Riqualificazione borgo GIMIGLIANO

ID	Nome attività	Durata
0	**Riqualificazione del borgo Gimigliano**	**120 g**
1	**Attività generali**	**120 g**
2	Allestimento cantiere	5 g
3	Approvvigionamento materiali	60 g
4	Smobilizzo cantiere	4 g
5	**Riqualifica zona sentiero**	**83 g**
6	Decespugliazione aree di intervento zona sentiero	1 g
7	Scavi e livellamenti zona sentiero	50 g
8	Realizzazione rete drenaggio acque meteoriche	50 g
9	Realizzazione di predisposizioni per impianto illuminazione	50 g
10	Realizzazione di getto per piano di posa pavimenti	50 g
11	Posa in opera nuova pavimentazione	50 g
12	Posa in opera nuovo parapetto zona sentiero	10 g
13	Ristrutturazione arco e muro controterra	15 g
14	Realizzazione pavimentazione zona piazzetta	15 g
15	Posa in opera nuovo parapetto zona piazzetta	2 g
16	Piantumazione aree a verde	5 g
17	**Riqualifica zona centro abitato**	**50 g**
18	Demolizione pavimentazione esistente	40 g
19	Realizzazione di getto per piano di posa pavimenti	40 g
20	Posa in opera nuova pavimentazione	40 g

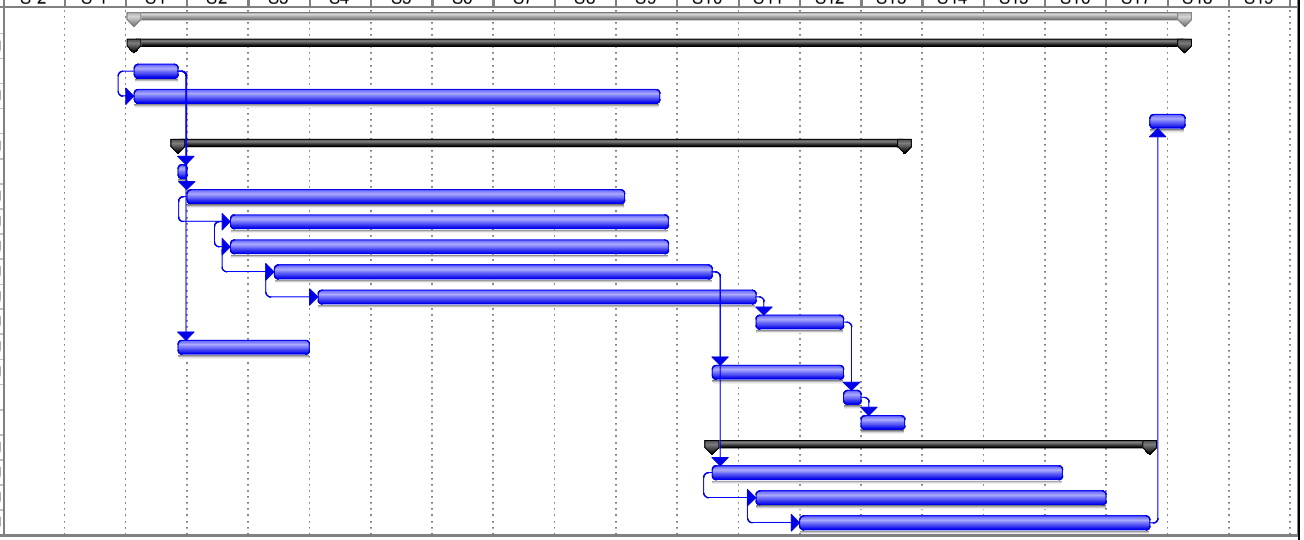

Attività | Avanzamento | Riepilogo | Attività esterne | Scadenza
Divisione | Cardine | Riepilogo progetto | Cardine esterno
