CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine
1	**Diagramma di Gantt**	**64/91**	**01/09/2021**	**30/11/2021**
2	Allestimento cantiere	3/3	01/09/2021	03/09/2021
3	Allestimento del cantiere stradale	5/5	13/09/2021	17/09/2021
4	Scavi, sbancamenti per lavori stradali	8/8	04/10/2021	13/10/2021
5	Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	2/2	14/10/2021	15/10/2021
6	Posa tubazioni prefabbricate in cemento	1/1	18/10/2021	18/10/2021
7	Posa in opera di gabbioni	1/1	19/10/2021	19/10/2021
8	Rinterro di scavo con mezzo meccanico	3/3	20/10/2021	22/10/2021
9	Esecuzione rilevato stradale con mezzi meccanici	9/9	25/10/2021	05/11/2021
10	Scavi di sbancamento a macchina	10/10	06/09/2021	17/09/2021
11	Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione	1/1	18/10/2021	18/10/2021
12	Posa delle tubazioni	1/1	19/10/2021	19/10/2021
13	Rinfianco e rinterro tubazioni	1/1	20/10/2021	20/10/2021
14	Scavo a trincea con mini escavatore	2/2	20/09/2021	21/09/2021
15	Posa di tubazione per linee elettriche	2/2	21/10/2021	22/10/2021
16	Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte	1/1	25/10/2021	25/10/2021
17	Rinfianco e rinterro con escavatore	1/1	26/10/2021	26/10/2021
18	Formazione blocco di fondazione getto con betoniera	2/2	22/09/2021	23/09/2021
19	Posa di palo di sostegno manuale	1/1	26/10/2021	26/10/2021
20	Opere in c.a. per lavori stradali	2/2	22/09/2021	23/09/2021
21	Posa cabina in cls prefabbricata	1/1	27/10/2021	27/10/2021
22	Lavori su quadri elettrici	2/2	28/10/2021	29/10/2021
23	Installazione apparecchiature elettriche	2/2	02/11/2021	03/11/2021
24	Installazione impianto di messa a terra	2/2	04/11/2021	05/11/2021
25	Lavori installazione segnalazione ostacolo	2/2	08/11/2021	09/11/2021
26	Compattazione meccanica del terreno	11/11	20/09/2021	14/10/2021

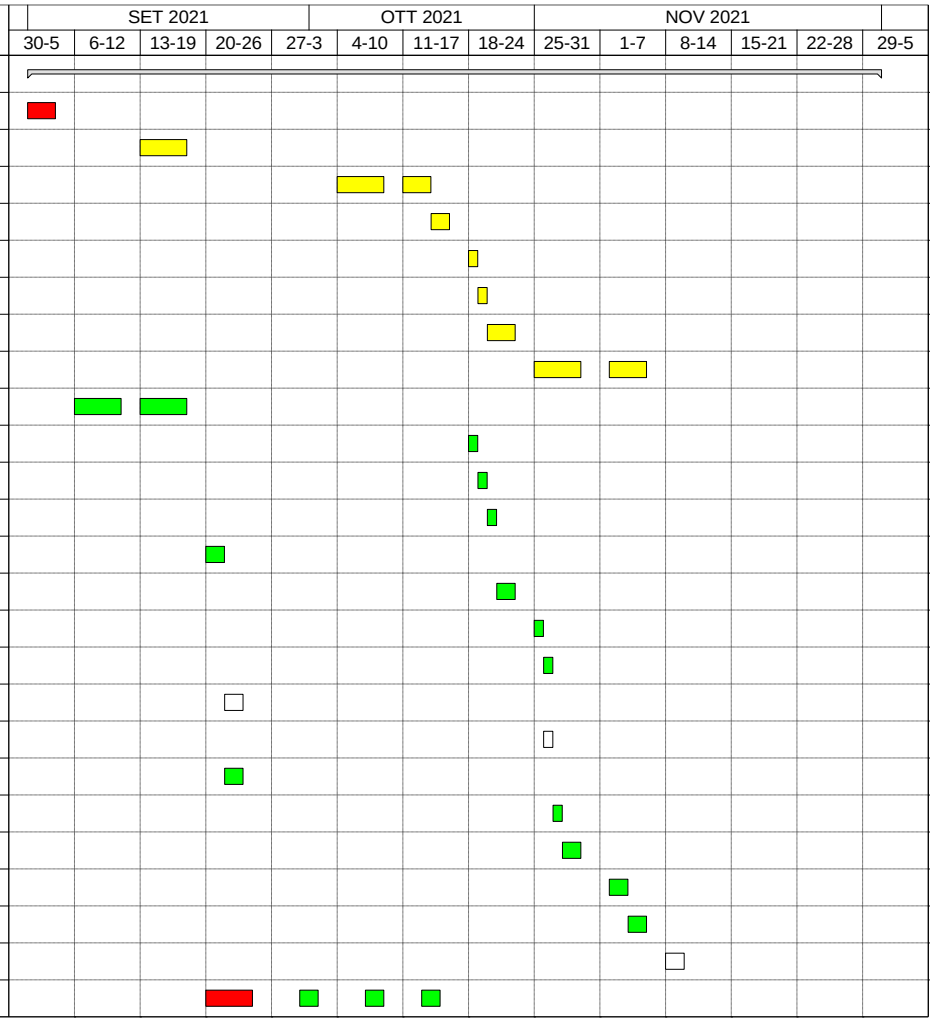

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine
27	Formazione di strato di base	3/3	27/09/2021	29/09/2021
28	Formazione di strati di fondazione in misto granulare	3/3	04/10/2021	06/10/2021
29	Formazione di strati di fondazione in misto cementato	2/2	11/10/2021	12/10/2021
30	Stesa manti bituminosi	5/5	08/11/2021	12/11/2021
31	Opere di completamento stradali	3/3	15/11/2021	17/11/2021
32	Segnaletica stradale	2/2	18/11/2021	19/11/2021
33	Posa barriera di sicurezza a bordo laterale	1/1	22/11/2021	22/11/2021
34	Scavo per recinzione	1/1	23/11/2021	23/11/2021
35	Recinzione e cancello metallici	2/2	24/11/2021	25/11/2021
36	Smobilizzo cantiere	3/3	26/11/2021	30/11/2021

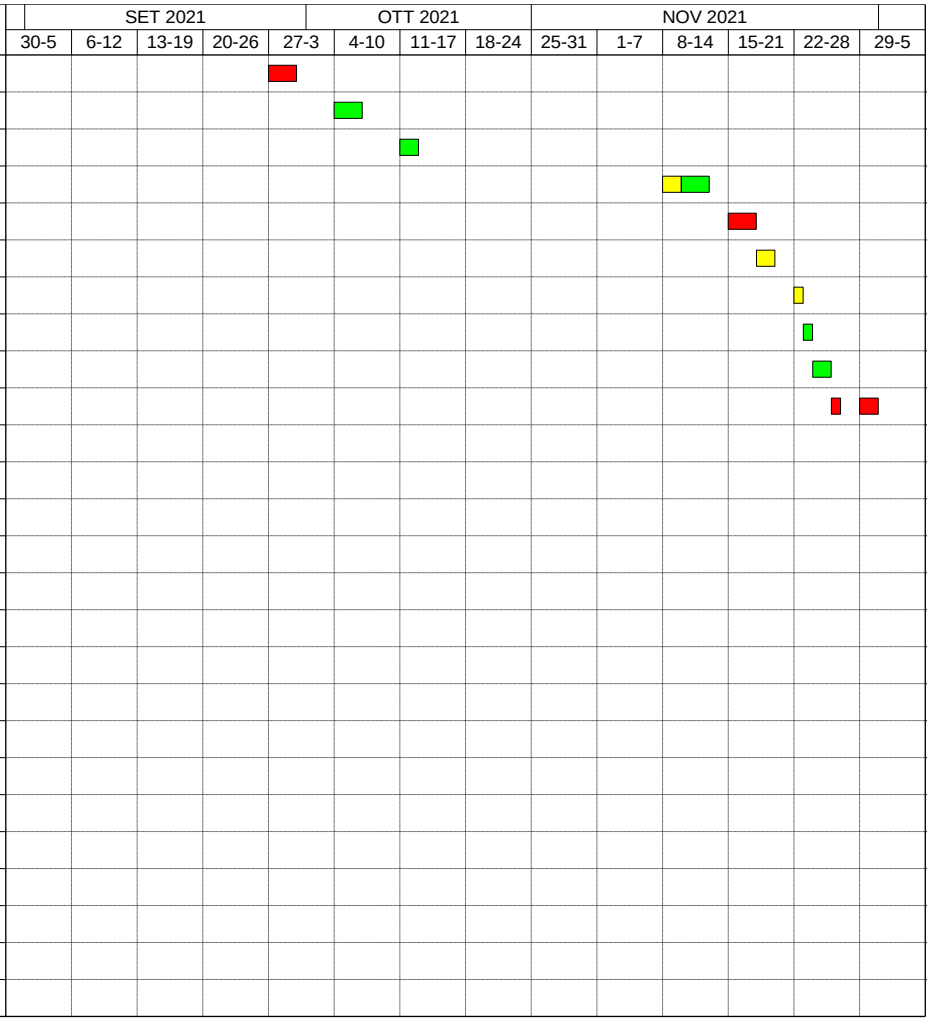

Legenda:

	Intero cantiere
	Area 1
	Area 2
	Area isolata (Nessuna interferenza)
