

Oggetto: CONSEGNA: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 17/11/2020, 20:03

A: posta@pec.studioantonini.com

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/11/2020 alle ore 20:03:23 (+0100) il messaggio "Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago" proveniente da "posta@pec.studioantonini.com" ed indirizzato a "mammoli.edilizia@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20201117200322.19604.665.1.63@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago

Mittente: Pec Studio Antonini <posta@pec.studioantonini.com>

Data: 17/11/2020, 20:03

A: mammoli.edilizia@pec.it

CC: comune.visso.mc@legalmail.it

Spettabile impresa Mammoli Edilizia Srl,

con riferimento al cantiere in oggetto il sottoscritto direttore dei lavori riscontra ad oggi un ritardo nella esecuzioni dei lavori rispetto alle previsioni del cronoprogramma approvato.

In particolare la consegna dei lavori è avvenuta con verbale in data 21/09/2020 e alla data odierna, oltre all'impianto di cantiere, sono state rimosse le alberature previste, demolito il fabbricato in legno, eseguito le operazioni di scavo e il getto del magrone.

In particolare nel sopralluogo del 24/10/2020, convocato per risolvere le problematiche legate alle infrastrutture rinvenute durante le opere di scavo, le operazioni di sbancamento erano completate.

A seguito degli interventi dell'azienda Ranton srl gestore delle linee gas e dell'Enel, avvenuti il giorno 28/10/2020, sono stati effettuati tutti i necessari spostamenti lasciando libera l'area dello scavo per consentire il proseguo dei lavori.

Da allora è stato eseguito unicamente il getto del magrone di pulizia il giorno 09/11/2020.

Analizzando il cronoprogramma approvato alla data attuale l'edificio destinato a bar doveva essere completato quantomeno nelle parti strutturali; di conseguenza il ritardo maturato

risulta consistente.

Si chiede quindi di proseguire con celerità le lavorazioni previste e di produrre entro tre giorni dalla presente un aggiornamento del programma esecutivo dei lavori previsto dall'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto, che dovrà tenere conto della scadenza dei lavori fissata per il giorno 19/01/2021, data ritenuta non prorogabile dalla Stazione Appaltante in quanto l'opera risulta legata ad un finanziamento che prevede scadenze certe.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

--

Nicola BERTINI

Ingegnere

studio ANTONINI

Architecture Engineering

Viale Luigi Chiavellati n.5

06034 FOLIGNO (PG)

ITALY

www.studioantonini.com

Tel/Fax: +39 0742/340900

E-mail: info@studioantonini.com

PEC: posta@pec.studioantonini.com

Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.

Grazie.

Confidentiality notice : this message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received.

Thank you.

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,0 kB
post-cert.eml	55,6 kB

Oggetto: CONSEGNA: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 17/11/2020, 20:03

A: posta@pec.studioantonini.com

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/11/2020 alle ore 20:03:24 (+0100) il messaggio "Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago" proveniente da "posta@pec.studioantonini.com" ed indirizzato a "comune.visso.mc@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec293.20201117200322.19604.665.1.63@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago" sent by "posta@pec.studioantonini.com", on 17/11/2020 at 20:03:24 (+0100) and addressed to "comune.visso.mc@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec293.20201117200322.19604.665.1.63@pec.aruba.it

— Allegati: —

dati-cert.xml

1,1 kB

Studio Antonini Srl

Da: "Studio Antonini Srl" <info@studioantonini.com>
Data: giovedì 26 novembre 2020 09:12
A: "Mammoli Edilizia srl (bar Visso)" <mammoli.edilizia@hotmail.com>
Oggetto: Cantiere bar del lago di Visso - Procedure di accettazione per cemento armato

Buonasera,

con riferimento all'argomento in oggetto, richiamando in premessa tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto, di seguito alcune indicazioni operative in merito ai controlli di accettazione che saranno eseguiti per le strutture in cemento armato gettato in opera, in conformità al DM 17 gennaio 2018 (NTC2018).

Tutte le forniture di acciaio per cemento armato dovranno essere accompagnate da attestato di denuncia dell'attività del centro di trasformazione che ha eseguito la fornitura, certificato di collaudo dell'acciaio timbrato e firmato dal fornitore, attestato di qualificazione sul quale saranno riportati i riferimenti della fornitura timbrato e firmato dal fornitore. Tali documenti dovranno essere consegnati o trasmessi al sottoscritto il giorno stesso della fornitura.

Il sottoscritto procederà al prelievo dei campioni da sottoporre a prova con le modalità stabilite dalla normativa vigente, redigendo apposito verbale di prelievo.

Tutte le forniture di calcestruzzo saranno accompagnate dal documento di trasporto che dovranno essere consegnati o trasmessi al sottoscritto il giorno stesso della fornitura.

L'impresa deve informare il sottoscritto del giorno stabilito per ciascun getto per consentire il controllo preventivo delle armature predisposte. Senza tale controllo l'impresa non è autorizzata ad eseguire il getto.

Si ricorda inoltre che i getti di calcestruzzo non potranno essere eseguiti con temperature inferiori a 5°C.

Nel giorno stabilito per il getto si procederà al prelievo dei campioni di calcestruzzo da sottoporre a prova nella quantità e con la frequenza stabilita dalla normativa vigente, redigendo apposito verbale di prelievo.

Si ricorda che in base a quanto previsto dalla normativa vigente l'esecuzione della prova di schiacciamento dei cubetti di calcestruzzo deve avvenire tra il 28esimo e il 45esimo giorno dopo il getto.

Cordiali saluti.

Nicola BERTINI
Ingegnere

studio ANTONINI srl
Viale Luigi Chiavellati n.5
06034 FOLIGNO (PG)
ITALY

www.studioantonini.com
Tel/Fax: +39 0742/340900
E-mail: info@studioantonini.com
PEC: posta@pec.studioantonini.com

26/11/2020

COMMITTENTE: COMUNE DI VISSO
IMPRESA EDILE APPALTATRICE: MAMMOLI EDILIZIA SRL
CANTIERE: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DEL LAGO

VERBALE DI SOPRALLUOGO n. 1 del 27/11/2020

- Al sopralluogo risultano presenti i Sigg.:

Sig. VICO LA BERTINI in qualità di **Coordinatore in fase di esecuzione**
Sig. GEOM. GIANLUCA TRASTULLI in qualità di DIPENDENTE
Sig. _____ in qualità di _____
Sig. _____ in qualità di _____
Sig. _____ in qualità di _____

- Imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere e relative maestranze:

Impresa MAMMOLI EDILIZIA SRL operaio KARAS GIZIM
operaio FOMA AJAZI TOMORR
operaio OLIVIERO RICCI
operaio _____

Impresa _____ operaio _____
operaio _____
operaio _____
operaio _____

Impresa _____ operaio _____
operaio _____
operaio _____
operaio _____

- stato dei lavori ed osservazioni:

SONO STATI REALIZZATI GLI SBANCAMENTI DI FONDAZIONE
E E' IN CORSO L'ARITATURA DELLA FONDAZIONE

- **prescrizioni:**

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DI UTENSILI
ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA DOVRÀ ESSERE
PREDISPOSTO UN PIANO DI CANTIERE CONFORME ALLE
CARATTERISTICHE INDICATE NEL PSC CON RELATIVO IMPIANTO
DI TERRA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RICHIEDUTA
DA SOGGETTO ABILITATO.

- **note:**

Le osservazioni e le prescrizioni riportate nel presente verbale non possono essere considerate dall'Impresa esecutrice (e/o dalle altre Ditte presenti) come esaustive di tutti gli obblighi posti a loro carico dalle norme vigenti per la tutela e la salvaguardia dei Lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Pertanto, il mantenimento nella norma del cantiere ai fini dell'igiene e della sicurezza dovrà essere un impegno costante e giornaliero, secondo quanto disposto in modo particolare dal DLgs 81/2008. Si prescrive alle Imprese esecutrici, e per esse al loro Responsabile di cantiere, di provvedere con la massima urgenza ad adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le anomalie riscontrate nel corso della visita e segnalate nel presente verbale.

La ripresa delle lavorazioni nelle fasi sospese potrà avvenire soltanto dopo la verifica e la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti prescritti.

Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori verificherà, con visite successive, il livello di sicurezza presente in cantiere.

La verifica viene conclusa alle ore 13:10.

Firme per accettazione

Il coordinatore per la sicurezza

PIANURA TRASTULLI



Oggetto: CONSEGNA: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Diffida al getto della fondazione

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 27/11/2020, 16:19

A: posta@pec.studioantonini.com

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/11/2020 alle ore 16:19:19 (+0100) il messaggio

"Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Diffida al getto della fondazione" proveniente da "posta@pec.studioantonini.com" ed indirizzato a "mammoli.edilizia@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec293.20201127161918.11905.661.1.66@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Diffida al getto della fondazione

Mittente: Pec Studio Antonini <posta@pec.studioantonini.com>

Data: 27/11/2020, 16:19

A: mammoli.edilizia@pec.it

CC: comune.visso.mc@legalmail.it

Spett.le impresa Mammoli Edilizia Srl,

durante la visita in cantiere effettuata in data odierna, alle ore 13:00, alla presenza del Geom. Gianluca Trastulli, ho constatato che il montaggio delle armature di fondazione dell'edificio adibito a bar non era completato; di conseguenza il sottoscritto non è stato in grado di effettuare un controllo delle stesse prima di autorizzare il getto della fondazione stessa.

Considerando il mancato preavviso, come richiesto specificatamente dal sottoscritto nella mail inviata in data 26 c.m., sulla volontà di eseguire il getto in data odierna e in virtù del mancato completamento del montaggio delle armature di fondazione previste nel progetto, questa direzione lavori non autorizza il getto della fondazione in data odierna.

A montaggio delle armature completato, l'impresa dovrà darne formale comunicazione al sottoscritto, al fine di poter procedere alla verifica sul posto per concedere l'autorizzazione al getto.

Distinti saluti

--

Nicola BERTINI
Ingegnere

studio ANTONINI

Architecture Engineering

Viale Luigi Chiavellati n.5

06034 FOLIGNO (PG)

ITALY

www.studioantonini.com

Tel/Fax: +39 0742/340900

E-mail: info@studioantonini.com

PEC: posta@pec.studioantonini.com

Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.

Grazie.

Confidentiality notice : this message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received.

Thank you.

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,0 kB
postacert.eml	54,0 kB

Oggetto: CONSEGNA: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Diffida al getto della fondazione

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 27/11/2020, 16:19

A: posta@pec.studioantonini.com

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/11/2020 alle ore 16:19:20 (+0100) il messaggio "Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Diffida al getto della fondazione" proveniente da "posta@pec.studioantonini.com" ed indirizzato a "comune.visso.mc@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec293.20201127161918.11905.661.1.66@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Diffida al getto della fondazione" sent by "posta@pec.studioantonini.com", on 27/11/2020 at 16:19:20 (+0100) and addressed to "comune.visso.mc@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec293.20201127161918.11905.661.1.66@pec.aruba.it

— Allegati: —

dati-cert.xml

1,2 kB

COMUNE DI VISSO
PROVINCIA DI MACERATA

OGGETTO: Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago.

COMMITTENTE: COMUNE DI VISSO

IMPRESA: MAMMOLI EDILIZIA SRL – Todi (PG) via A. Cortesi n. 65

CONTRATTO: Contratto stipulato in data 17/09/2020 rep. n. 663.

ORDINE DI SERVIZIO

n. 1

Il sottoscritto **Ing. Nicola Bertini** direttore dei lavori, in base al sopralluogo effettuato in data 30/11/2020, ha accertato che la Vs. impresa ha disatteso la diffida del sottoscritto, inviata con pec del 27/11/2020, a non eseguire il getto della fondazione dell'edificio adibito a bar per i motivi ivi indicati.

Al momento del sopralluogo la fondazione risultava eseguita.

Al fine di accertare quanto realizzato il sottoscritto,

ORDINA

all'impresa affidataria di predisporre i necessari tracciamenti al fine di verificare il rispetto delle misure indicate nel progetto esecutivo. La verifica avverrà il giorno 01/12/2020 alle ore 12:00.

L'impresa affidataria dovrà inoltre mettere a disposizione del sottoscritto, nel giorno indicato per la verifica in cantiere, operai, mezzi e quanto occorrente per l'effettuazione di misurazioni, saggi e quanto necessario all'accertamento della corretta esecuzione dell'opera fondale.

Le operazioni di cui sopra devono considerarsi propedeutiche all'esecuzione di altre ed eventuali verifiche ad esito delle quali il sottoscritto si riserva di adottare i necessari provvedimenti, nessuno escluso.

Copia del presente ordine di servizio deve essere restituito a questa Direzione dei lavori debitamente firmato per ricevuta e impegno di adempimento.

Foligno, 30/11/2020

L'IMPRESA

.....



Oggetto: CONSEGNA: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Ordine di servizio n. 1

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 30/11/2020, 14:50

A: posta@pec.studioantonini.com

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/11/2020 alle ore 14:50:52 (+0100) il messaggio

"Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Ordine di servizio n. 1" proveniente da "posta@pec.studioantonini.com" ed indirizzato a "mammoli.edilizia@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec293.20201130145051.05033.994.2.63@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Ordine di servizio n. 1

Mittente: Pec Studio Antonini <posta@pec.studioantonini.com>

Data: 30/11/2020, 14:50

A: mammoli.edilizia@pec.it

Spett.le impresa Mammoli Edilizia Srl,

con la presente si trasmette quanto in oggetto.

Distinti saluti.

--

Nicola BERTINI

Ingegnere

studio ANTONINI

Architecture Engineering

Viale Luigi Chiavellati n.5

06034 FOLIGNO (PG)

ITALY

www.studioantonini.com

Tel/Fax: +39 0742/340900

E-mail: info@studioantonini.com

PEC: posta@pec.studioantonini.com

Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi

strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.
Grazie.

Confidentiality notice : this message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received.
Thank you.

— Allegati: —

daticert.xml	969 bytes
postacert.eml	185 kB
1408 Ordine di servizio n.1.pdf	96,2 kB

COMUNE DI VISSO
PROVINCIA DI MACERATA

OGGETTO: Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago.

COMMITTENTE: COMUNE DI VISSO

IMPRESA: MAMMOLI EDILIZIA SRL – Todi (PG) via A. Cortesi n. 65

CONTRATTO: Contratto stipulato in data 17/09/2020 rep. n. 663.

ORDINE DI SERVIZIO

n. 2

Il sottoscritto **Ing. Nicola Bertini** direttore dei lavori, richiamati i contenuti del precedente ordine di servizio n. 1 in data 30/11/2020, a seguito dei riscontri effettuati nel sopralluogo del 01/12/2020, ha eseguito in data odierna rilievo topografico di precisione per verificare la bontà dei tracciamenti predisposti dall'impresa e sulla base dei quali la stessa ha eseguito il getto non autorizzato della fondazione in cemento armato.

Sulla base dei rilievi eseguiti emergono delle difformità tra quanto realizzato e quanto previsto nel progetto esecutivo approvato.

Per tali motivi, in attesa di una disamina approfondita delle problematiche rilevate, il sottoscritto,

ORDINA

all'impresa affidataria di sospendere le lavorazioni riguardanti il nuovo edificio da adibire a bar.

Il sottoscritto procederà con successivo ordine di servizio ad indicare all'impresa i saggi e le prove da eseguire per accertare la corretta esecuzione del getto della fondazione.

Con le finalità di cui sopra si chiede all'impresa affidataria di fornire al sottoscritto copia dei documenti di trasporto relativi alle forniture di calcestruzzo e dell'acciaio impiegati nel getto della fondazione, oltre a documentazione fotografica inerente il montaggio delle armature, se a disposizione.

Il sottoscritto si riserva di adottare i necessari provvedimenti solo all'esito delle verifiche di cui sopra.

Copia del presente ordine di servizio deve essere restituito a questa Direzione dei lavori debitamente firmato per ricevuta e impegno di adempimento.

Foligno, 03/12/2020

L'IMPRESA



Oggetto: CONSEGNA: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Ordine di servizio n. 2

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 03/12/2020, 19:06

A: posta@pec.studioantonini.com

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/12/2020 alle ore 19:06:05 (+0100) il messaggio

"Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Ordine di servizio n. 2" proveniente da "posta@pec.studioantonini.com" ed indirizzato a "mammoli.edilizia@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec293.20201203190604.07904.193.1.65@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Ordine di servizio n. 2

Mittente: Pec Studio Antonini <posta@pec.studioantonini.com>

Data: 03/12/2020, 19:06

A: mammoli.edilizia@pec.it

Spett.le impresa Mammoli Edilizia Srl,

con la presente si trasmette quanto in oggetto.

Distinti saluti.

--

Nicola BERTINI

Ingegnere

studio ANTONINI

Architecture Engineering

Viale Luigi Chiavellati n.5

06034 FOLIGNO (PG)

ITALY

www.studioantonini.com

Tel/Fax: +39 0742/340900

E-mail: info@studioantonini.com

PEC: posta@pec.studioantonini.com

Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.
Grazie.

Confidentiality notice : this message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received.
Thank you.

— Allegati: —	
dati-cert.xml	969 bytes
post-cert.eml	185 kB
1408 Ordine di servizio n.2.pdf	95,8 kB

Oggetto: CONSEGNA: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Riscontro inosservanza ordine di servizio n.2 del 03/12/2020

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 04/12/2020, 17:47

A: posta@pec.studioantonini.com

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/12/2020 alle ore 17:47:16 (+0100) il messaggio

"Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Riscontro inosservanza ordine di servizio n.2 del 03/12/2020" proveniente da "posta@pec.studioantonini.com"

ed indirizzato a "mammoli.edilizia@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec293.20201204174716.32488.877.1.66@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Riscontro inosservanza ordine di servizio n.2 del 03/12/2020

Mittente: Pec Studio Antonini <posta@pec.studioantonini.com>

Data: 04/12/2020, 17:47

A: mammoli.edilizia@pec.it

CC: comune.visso.mc@legalmail.it

Spett.le impresa Mammoli Edilizia Srl,

in base al sopralluogo effettuato in data odierna il sottoscritto ha riscontrato l'inosservanza dell'ordine contenuto nel documento in oggetto, inviato con pec del 03/12/2020, di sospendere le lavorazioni riguardanti il nuovo edificio da adibire a bar, in attesa delle necessarie verifiche da compiere.

All'atto del sopralluogo in cantiere erano presenti maestranze impegnate nel montaggio dell'armatura dei pilastri.

Si ribadisce l'ordine di sospendere tutte le lavorazioni riguardanti il nuovo edificio da adibire a bar, compreso il montaggio delle armature dei pilastri, fino all'emissione da parte del sottoscritto dei provvedimenti necessari per risolvere le problematiche riscontrate in cantiere, come meglio precisate negli ordini di servizio emessi.

Si precisa sin da ora che per l'onere di eventuali smontaggi e rimontaggi dell'armatura dei pilastri, qualora si rendessero necessari per risolvere le problematiche contestate, la Vs. impresa non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Distinti saluti --

Nicola BERTINI

Ingegnere

studio ANTONINI

Architecture Engineering

Viale Luigi Chiavellati n.5

06034 FOLIGNO (PG)

ITALY

www.studioantonini.com

Tel/Fax: +39 0742/340900

E-mail: info@studioantonini.com

PEC: posta@pec.studioantonini.com

Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.

Grazie.

Confidentiality notice : this message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received.

Thank you.

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,1 kB
post-cert.eml	55,1 kB

Oggetto: CONSEGNA: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Riscontro inosservanza ordine di servizio n.2 del 03/12/2020

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 04/12/2020, 17:47

A: posta@pec.studioantonini.com

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/12/2020 alle ore 17:47:17 (+0100) il messaggio "Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Riscontro inosservanza ordine di servizio n.2 del 03/12/2020" proveniente da "posta@pec.studioantonini.com" ed indirizzato a "comune.visso.mc@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec293.20201204174716.32488.877.1.66@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Riscontro inosservanza ordine di servizio n.2 del 03/12/2020" sent by "posta@pec.studioantonini.com", on 04/12/2020 at 17:47:17 (+0100) and addressed to "comune.visso.mc@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec293.20201204174716.32488.877.1.66@pec.aruba.it

— Allegati: —

dati-cert.xml

1,2 kB

COMUNE DI VISSO
PROVINCIA DI MACERATA

OGGETTO: Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago.

COMMITTENTE: COMUNE DI VISSO

IMPRESA: MAMMOLI EDILIZIA SRL – Todi (PG) via A. Cortesi n. 65

CONTRATTO: Contratto stipulato in data 17/09/2020 rep. n. 663.

ORDINE DI SERVIZIO

n. 3

Il sottoscritto **Ing. Nicola Bertini** direttore dei lavori, richiamati i contenuti dei precedenti ordini di servizio n.1 del 30/11/2020 e n.2 del 03/12/2020, con la finalità di verificare l'esecuzione del getto di fondazione,

ORDINA

all'impresa affidataria di eseguire i saggi e le prove (carotaggi) indicate nell'elaborato grafico allegato al presente ordine di servizio.

In particolare all'esecuzione dei saggi su copriferro provvederà l'impresa affidataria mentre per il controllo della resistenza del calcestruzzo in opera l'impresa dovrà incaricare un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 che provvederà ad eseguire e certificare le prove sulle carote estratte.

Considerando che il getto della fondazione è avvenuto in data 27/11/2020 le operazioni di estrazione delle carote in cantiere dovranno avvenire a partire dal giorno 11/12/2020 e comunque entro il giorno 14/12/2020.

Al sottoscritto compete il coordinamento delle operazioni di estrazione delle carote, di conseguenza si chiede di essere informati preventivamente del giorno e ora stabiliti.

I cubetti di calcestruzzo prelevati durante il getto della fondazione da parte dell'impresa, come dichiarato dalla stessa nell'incontro del 01/12/2020 presso il Comune di Visso, devono essere messi a disposizione del sottoscritto per l'identificazione e per il successivo invio ad un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, che provvederà ad eseguire la prova di schiacciamento successivamente al 28esimo giorno dall'avvenuto getto.

Si rinnova la richiesta contenuta nell'ordine di servizio n. 2 del 03/12/2020 di fornire al sottoscritto copia dei documenti di trasporto relativi alle forniture di calcestruzzo e dell'acciaio impiegati nel getto della fondazione, oltre a documentazione fotografica inerente il montaggio delle armature, se a disposizione.

Il sottoscritto si riserva di adottare i necessari provvedimenti solo all'esito delle verifiche di cui sopra.

Copia del presente ordine di servizio deve essere restituito a questa Direzione dei lavori debitamente firmato per ricevuta e impegno di adempimento.


Foligno, 07/12/2020

L'IMPRESA



ALLEGATO A ORDINE
DI SERVIZIO N. 3

Pianta delle PLATEA di FONDAZIONI

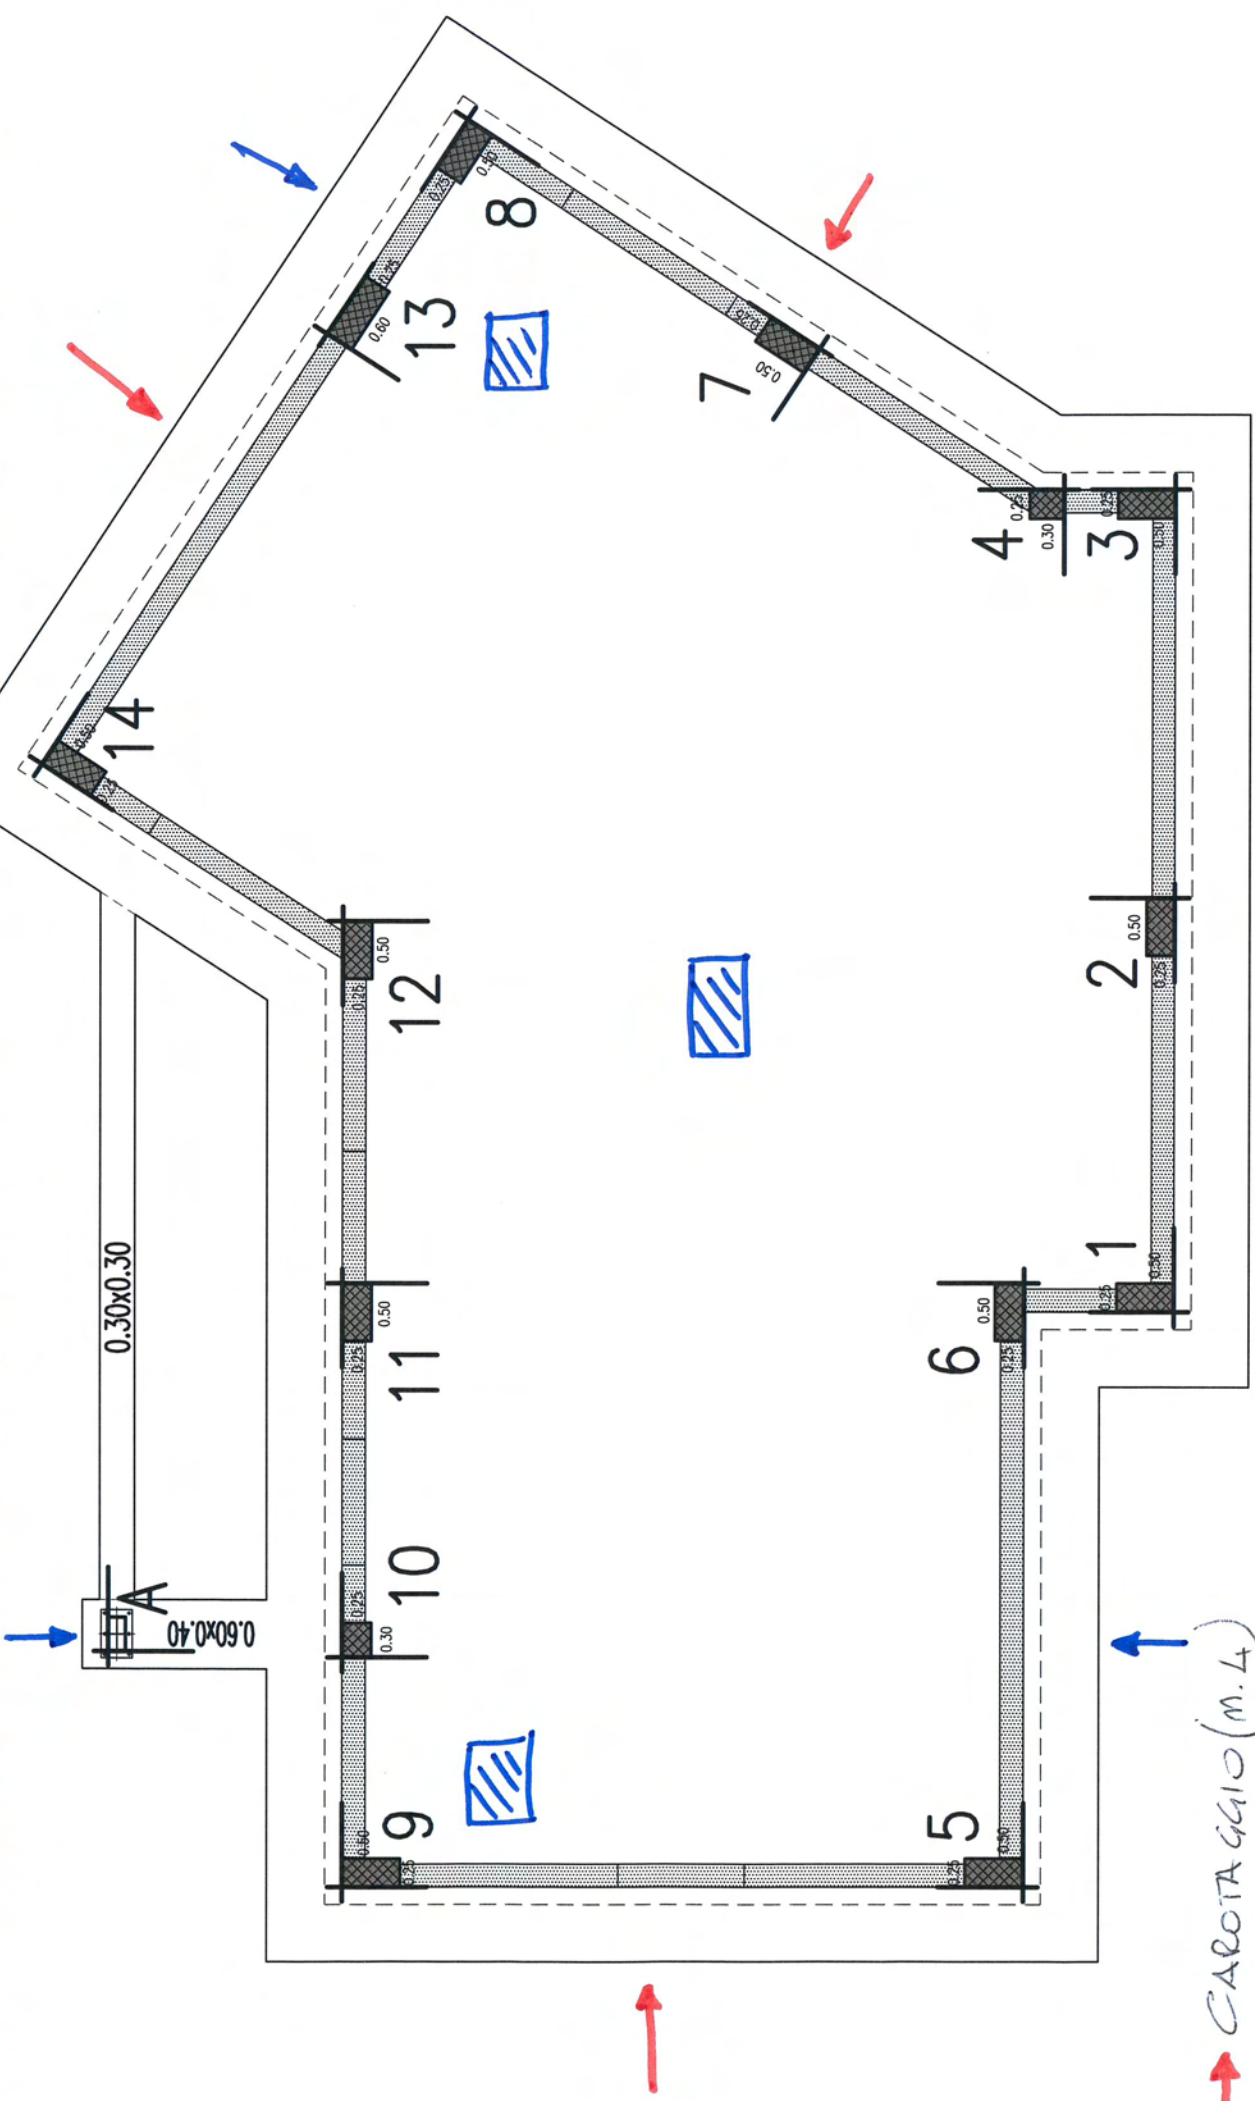

- CAROTA G.10 (M.4)
- SAGGIO VERTICALE SU COPRIFERRO 30x30 cm (M.3)
- SAGGIO IN PIANTA SU COPRIFERRO 30x30 cm (M.3)

Oggetto: CONSEGNA: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Ordine di servizio n. 3

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 07/12/2020, 11:57

A: posta@pec.studioantonini.com

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/12/2020 alle ore 11:57:57 (+0100) il messaggio

"Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Ordine di servizio n. 3" proveniente da "posta@pec.studioantonini.com" ed indirizzato a "mammoli.edilizia@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec293.20201207115754.15574.915.1.63@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Ordine di servizio n. 3

Mittente: Pec Studio Antonini <posta@pec.studioantonini.com>

Data: 07/12/2020, 11:57

A: mammoli.edilizia@pec.it

CC: comune.visso.mc@legalmail.it

Spett.le impresa Mammoli Edilizia Srl,

con la presente si trasmette quanto in oggetto.

Distinti saluti.

--

Nicola BERTINI

Ingegnere

studio ANTONINI

Architecture Engineering

Viale Luigi Chiavellati n.5

06034 FOLIGNO (PG)

ITALY

www.studioantonini.com

Tel/Fax: +39 0742/340900

E-mail: info@studioantonini.com

PEC: posta@pec.studioantonini.com

Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale.
Grazie.

Confidentiality notice : this message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received.
Thank you.

— Allegati: —	
dati-cert.xml	1,0 kB
postacert.eml	814 kB
1408 Ordine di servizio n.3.pdf	554 kB

Oggetto: CONSEGNA: Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Ordine di servizio n. 3

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 07/12/2020, 11:57

A: posta@pec.studioantonini.com

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/12/2020 alle ore 11:57:57 (+0100) il messaggio "Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Ordine di servizio n. 3" proveniente da "posta@pec.studioantonini.com" ed indirizzato a "comune.visso.mc@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec293.20201207115754.15574.915.1.63@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Comune di Visso - Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione dei giardini del lago - Ordine di servizio n. 3" sent by "posta@pec.studioantonini.com", on 07/12/2020 at 11:57:57 (+0100) and addressed to "comune.visso.mc@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec293.20201207115754.15574.915.1.63@pec.aruba.it

— Allegati: —

daticert.xml

1,2 kB
